

EGM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ.: 07.605.578/0001-10

Ofício 004/2023

SOLICITAÇÃO DA QUARTA MEDIÇÃO

PROC. N° 129-A/CMAAP/2023. TOMADA DE PREÇO 001/2023 EMPRENHO 291

CONTRATO 005/2023 -

OBJETO: REFORMA DO PLENÁRIO E CONSTRUÇÃO DE SALA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS – RO CNPJ 01.640.319/0001-44, situada na Av. Afonso Pena, 3951, Cento de Alto Alegre dos Parecis RO, neste ato representado pelo seu presidente, VALMIRO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, portador do CPF.: 409.019.632-91.

A Empresa **E. G. M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.605.578/0001-10**. Vem através desta solicitar **A QUARTA MEDIÇÃO**. Conforme os anexos do diário de obra e relatório fotográfico, do objeto citado acima.

Aguardando deferimento.

Rolim de Moura/RO, 18 de dezembro de 2023.

EGM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

. CNPJ: 07.605.578/0001-10



	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000048
	Dias Decorridos: 61	Data: 01/12/2023 (Sexta-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 100	Início: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		

Comentários
FECHAMENTO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0.0	UN	nenhum	

Galeria de Fotos	
FECHAMENTO DO QUADRO DE ENERGIA 	

Fiscal

Responsável Técnico


Osni Schneider
Engenheiro Civil
CREA-18139-D/RO

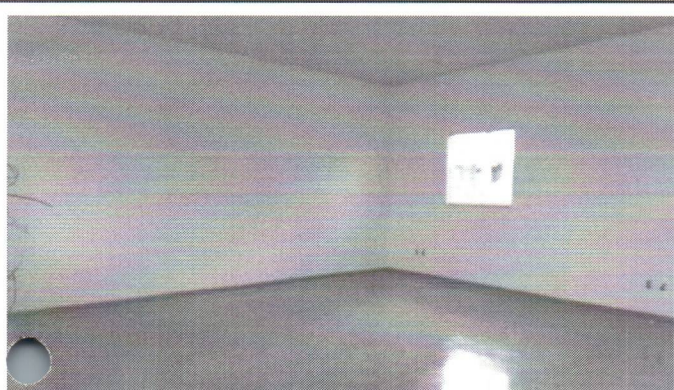
	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000049
	Dias Decorridos: 64	Data: 04/12/2023 (Segunda-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 97	Início: 02/10/2023
Endereço:	Termino Previsto: 10/03/2024	
Relatório Diário de Obra		

Comentários
PORCELANATO

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PORCELANATO RETIFICADO 90X90CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
ACENTAMENTO DE PORCELANATO 	

Fiscal

Responsável Técnico

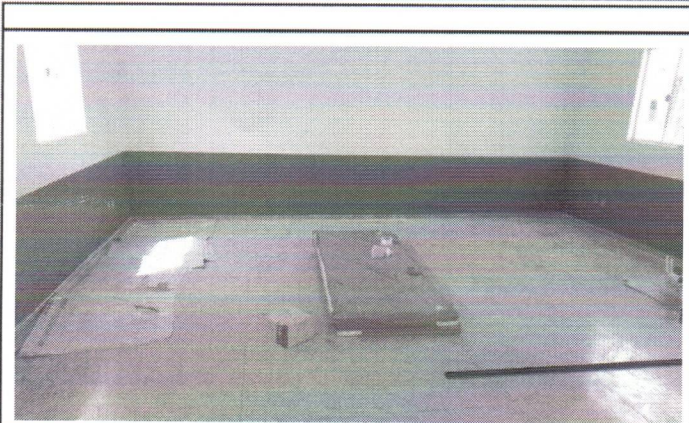

Osni Schineider
Engenheiro Civil
CREA-18139-D/RO

	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000050
	Dias Decorridos: 64	Data: 04/12/2023 (Segunda-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 97	Início: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PORCELANATO RETIFICADO 90X90CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
	

Fiscal

Responsável Técnico


Osni Schineider
Engenheiro Civil
CREA-18139-D/RO

	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000050
	Dias Decorridos: 65	Data: 05/12/2023 (Terça-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 96	Início: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PORCELANATO RETIFICADO 90X90CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
	

Fiscal

Responsável Técnico


Osni Schineider
 Engenheiro Civil
 CREA-18139-D/RO

	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000051
	Dias Decorridos: 66	Data: 06/12/2023 (Quarta-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 95	Início: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		

Comentários
PORCELANATO

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PORCELANATO RETIFICADO 90X90CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
PORCELANATO 	

Fiscal

Responsável Técnico


Osni Schineider
Engenheiro Civil
CREA-18139-D/RO

	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000052
	Dias Decorridos: 67	Data: 07/12/2023 (Quinta-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 94	Início: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PORCELANATO RETIFICADO 90X90CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
PORCELANATO 	

Fiscal

Responsável Técnico


Osni Schineider
 Engenheiro Civil
 CREA-18139-D/RO

	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000053
	Dias Decorridos: 68	Data: 08/12/2023 (Sexta-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 93	Início: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
PINTURA FORRO 	

Fiscal

Responsável Técnico

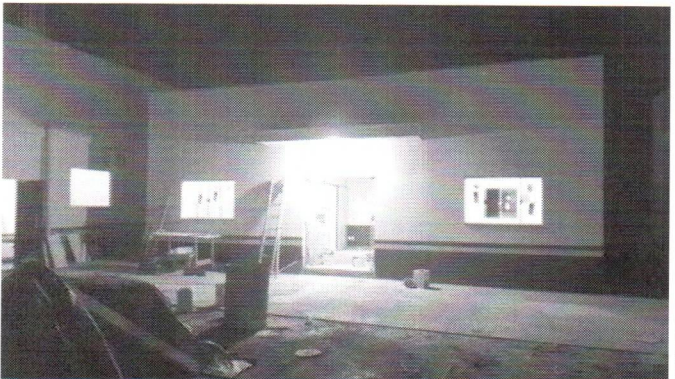

Osni Schineider
 Engenheiro Civil
 CREA-18139-D/RO

	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000054
	Dias Decorridos: 71	Data: 11/12/2023 (Segunda-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Término: 90	Início: 02/10/2023
Endereço:	Término Previsto: 10/03/2024	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	0.0	UN	nenhum	

Galeria de Fotos	
ILUMINAÇÃO 	

Fiscal

Responsável Técnico


Osni Schineider
Engenheiro Civil
CREA-18139-D/RO

	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000055
	Dias Decorridos: 72	Data: 12/12/2023 (Terça-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Termino: 89	Inicio: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220V/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	0.0	UN	nenhum	

Galeria de Fotos

ILUMINAÇÃO



Fiscal

Responsável Técnico

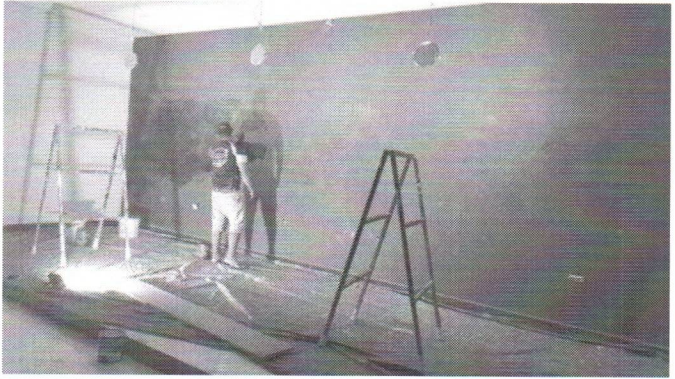

Osni Schineider
Engenheiro Civil
CREA-18139-D/RO

	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000056
	Dias Decorridos: 73	Data: 13/12/2023 (Quarta-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 88	Início: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
PINTURA 	

Fiscal

Responsável Técnico


Osni Schneider
 Engenheiro Civil
 CREA-18139-D/RO

	Dias Contratuais: 161	RDO: 00000057
	Dias Decorridos: 74	Data: 14/12/2023 (Quinta-Feira)
Obra: CARAMA ALTO ALEGRE AUDITORIO E SALA ADM	Dias para Terminar: 87	Início: 02/10/2023
Endereço:		Termino Previsto: 10/03/2024
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
PEDREIRO (HORISTA)	3	
SERVENTE DE OBRAS	3	
MESTRE DE OBRA	1	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3	
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
PINTURA MARMORIZADA 	

Fiscal

Responsável Técnico


Osni Schineider
 Engenheiro Civil
 CREA-18139-D/RO



► Maquetes em 3D
► Projetos para Caixa
► Projetos Residenciais e Comercial
► Planilha Orçamentária
► Desmembramento
► Regularização



ENGENHEIRO CIVIL
JEAN LIMA
Edificando ideias, construindo sonhos

☎ 69 98411-6168 ✉ eng.civ.lima@gmail.com

CREA 6443 EM/RO

CREA: 17650 D/RO



TERMO DE FISCALIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DE OBRAS

CONTRATO: 05/2023

PROCESSO: 129-A/CMAAP/2023


OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA ADMINISTRATIVA E REFORMA DO
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO

TERMO DE RECEBIMENTO – 4º MEDIÇÃO


Conforme vistoria realizada “*in loco*” pela fiscalização e pela comissão de Recebimento de Obras, definida através da portaria nº 007/2022, foi constatada a execução **PARCIAL** dos serviços, conforme especificado no relatório e planilha em anexo, com os devidos valores e percentuais da obra executada.


Sendo verdade o que foi verificado, assina a Fiscalização e a Comissão de Recebimento de Obras o presente Termo de Recebimento.

Alto Alegre dos Parecis-RO, 28 de dezembro de 2023


Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Fiscal
CREA 17650 D/RO


Julieverson Teixeira Fernandes
Membro efetivo


Gilson Rodrigues Borges
Presidente


Jean Carlos da Silva Moura
Membro efetivo



Obra: REFORMA DO PLENÁRIO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARACURUS
Bancos: SINAPI - 06/2023 - RondôniaSBC - 07/2023 - Rondônia
BDI: 22,47%
Encargos: NÃO DESONERADO

PLANILHA DE MEDIÇÃO															
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	PRECEDENTE (%)	3ª MEDIÇÃO		REMANESCENTE			
										Quant.	Valor	Quant.	Valor		
1															
1.1	90777 SINAPI	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE													
1.1.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78	R\$ 115,24	R\$ 141,13	R\$ 11.008,14	54,60	70%	R\$ 7.705,69	11,7	15%	R\$ 1.651,22		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	742090001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	R\$ 355,19	R\$ 435,00	R\$ 2.610,00	2,50	40%	R\$ 3.929,18	-	0%	R\$ -		
2.2	001 Proprio	TAXAS E ENROLIMENTOS	UN	1	R\$ 230,67	R\$ 282,50	R\$ 282,50	1,00	100%	R\$ 282,50	-	0%	R\$ -		
2.3	CPU052206 Proprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	M²	6	R\$ 696,55	R\$ 853,06	R\$ 5.118,36	3,00	50%	R\$ 2.559,18	-	0%	R\$ -		
3		CONSTRUÇÃO DA SALA ADMINISTRATIVA													
3.1		INFRAESTRUTURA													
3.1.1	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	60,72	R\$ 53,66	R\$ 65,71	R\$ 3.989,91	60,72	77%	R\$ 116.257,31	-	18%	R\$ 27.007,19		
3.1.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	8,05	R\$ 89,08	R\$ 109,09	R\$ 878,17	8,05	100%	R\$ 878,17	-	0%	R\$ -		
3.1.3	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,8	R\$ 34,52	R\$ 42,27	R\$ 202,89	4,80	100%	R\$ 202,89	-	0%	R\$ -		
3.1.4	COMP-687 Proprio	ALVENARIA EMBOAMENTO TIPOLO CERÂMICO FURADO 9X14X24 CM	m²	8,74	R\$ 86,99	R\$ 106,53	R\$ 931,07	0,00	0%	R\$ -	-	0%	R\$ -		
3.1.5	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,06	R\$ 20,69	R\$ 25,33	R\$ 989,38	39,06	100%	R\$ 989,38	-	0%	R\$ -		
3.1.6	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,07	R\$ 18,26	R\$ 22,36	R\$ 1.253,72	56,07	100%	R\$ 1.253,72	-	0%	R\$ -		
3.1.7	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	95,22	R\$ 16,37	R\$ 20,04	R\$ 1.908,20	95,22	100%	R\$ 1.908,20	-	0%	R\$ -		
3.1.8	96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,57	R\$ 13,84	R\$ 16,94	R\$ 416,21	24,57	100%	R\$ 416,21	-	0%	R\$ -		
3.1.9	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	36,09	R\$ 70,33	R\$ 86,13	R\$ 3.108,43	36,09	100%	R\$ 3.108,43	-	0%	R\$ -		
3.1.10	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,65	R\$ 651,69	R\$ 798,12	R\$ 2.115,01	2,65	100%	R\$ 2.115,01	-	0%	R\$ -		
3.1.11	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m²	2,65	R\$ 298,86	R\$ 366,01	R\$ 969,92	2,65	100%	R\$ 969,92	-	0%	R\$ -		
3.1.12	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	20,59	R\$ 56,55	R\$ 69,25	R\$ 1.425,85	20,59	100%	R\$ 1.425,85	-	0%	R\$ -		
3.2		SUPERESTRUTURA													
3.2.1	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREO OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	112,77	R\$ 21,23	R\$ 26,00	R\$ 30.879,63	112,77	100%	R\$ 30.879,63	-	0%	R\$ -		
3.2.2	92776 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREO OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,51	R\$ 19,82	R\$ 24,27	R\$ 85,18	3,51	100%	R\$ 85,18	-	0%	R\$ -		
3.2.3	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREO OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,82	R\$ 18,41	R\$ 22,54	R\$ 2.024,54	89,82	100%	R\$ 2.024,54	-	0%	R\$ -		
3.2.4	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREO OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	203,49	R\$ 16,36	R\$ 20,03	R\$ 4.075,90	203,49	100%	R\$ 4.075,90	-	0%	R\$ -		
3.2.5	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,1	R\$ 18,52	R\$ 22,68	R\$ 47,62	2,10	100%	R\$ 47,62	-	0%	R\$ -		
3.2.6	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,7	R\$ 16,22	R\$ 19,86	R\$ 331,66	16,70	100%	R\$ 331,66	-	0%	R\$ -		
3.2.7	92448 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,77	R\$ 140,41	R\$ 171,96	R\$ 6.666,88	38,77	100%	R\$ 6.666,88	-	0%	R\$ -		
3.2.8	CPU052204 Proprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	47,88	R\$ 117,56	R\$ 143,97	R\$ 6.893,28	47,88	100%	R\$ 6.893,28	-	0%	R\$ -		
3.2.9	92482 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	2,21	R\$ 281,65	R\$ 344,93	R\$ 762,29	2,21	100%	R\$ 762,29	-	0%	R\$ -		
3.2.10	101792 SINAPI	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	2,21	R\$ 14,61	R\$ 17,89	R\$ 39,53	2,21	100%	R\$ 39,53	-	0%	R\$ -		
3.2.11	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	4,57	R\$ 651,69	R\$ 798,12	R\$ 3.647,40	4,57	100%	R\$ 3.647,40	-	0%	R\$ -		
3.2.12	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m²	4,57	R\$ 298,86	R\$ 366,01	R\$ 1.672,66	4,57	100%	R\$ 1.672,66	-	0%	R\$ -		
3.2.13	93186 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,5	R\$ 84,43	R\$ 103,40	R\$ 775,50	7,50	100%	R\$ 775,50	-	0%	R\$ -		
3.2.14	93196 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,5	R\$ 82,30	R\$ 100,79	R\$ 755,92	7,50	100%	R\$ 755,92	-	0%	R\$ -		
3.2.15	93188 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,8	R\$ 76,78	R\$ 94,03	R\$ 169,25	1,80	100%	R\$ 169,25	-	0%	R\$ -		
3.3		PAREDES E PAINÉIS													
3.3.1	CPU052202 Proprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X24CM (ESPESURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	106,77	R\$ 115,54	R\$ 141,50	R\$ 15.107,95	106,77	100%	R\$ 26.582,04	-	0%	R\$ -		
3.3.2	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	278,43	R\$ 7,24	R\$ 8,86	R\$ 2.466,88	278,43	100%	R\$ 2.466,88	-	0%	R\$ -		
3.3.3	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	278,43	R\$ 26,42	R\$ 32,35	R\$ 9.007,21	278,43	100%	R\$ 9.007,21	-	0%	R\$ -		
3.4		PISO E PAVIMENTAÇÃO													
3.4.1	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	11,18	R\$ 79,53	R\$ 97,40	R\$ 1.088,93	11,18	16%	R\$ 19.858,26	-	84%	R\$ 16.776,01		





Obra: REFORMA DO PLENÁRIO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DO PARCIS/RO
Bancos: SINAPI - 06/2023 - RondôniaSBC - 07/2023 - Rondônia
BDI: 22,47%
Encargos: NÃO DESONERADO

PLANILHA DE MEDIÇÃO																
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	PRECEDENTE		3ª MEDIÇÃO		REMANESCENTE			
									(%)	Valor	Quant.	(%)	Valor	Quant.	(%)	Valor
3.4.2	CPU-Próprio	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS C84191	m²	55,92	R\$ 215,75	R\$ 264,22	R\$ 14.775,18	0,00	0%	R\$ -	55,92	100%	R\$ 14.775,18	0,00	0%	R\$ -
3.4.3	130324 SBC	RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	M	29,62	R\$ 55,16	R\$ 67,55	R\$ 2.000,83	0,00	0%	R\$ -	29,62	100%	R\$ 2.000,83	0,00	0%	R\$ -
3.4.4	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	1,5	R\$ 943,50	R\$ 1.155,50	R\$ 1.733,25	1,50	100%	R\$ 1.733,25	1,50	100%	R\$ 1.733,25	0,00	0%	R\$ -
3.4.5	CPU 27	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETACHADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	1,47	R\$ 144,46	R\$ 176,92	R\$ 260,07	1,47	100%	R\$ 260,07	1,47	100%	R\$ 260,07	0,00	0%	R\$ -
3.5		FORRO E COBERTURA														
3.5.1	92608 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO CÁMERO. AF_12/2015	UN	5	R\$ 1.357,93	R\$ 1.663,05	R\$ 8.315,25	5,00	100%	R\$ 8.315,25	5,00	100%	R\$ 8.315,25	0,00	0%	R\$ -
3.5.2	92590 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	55,92	R\$ 58,76	R\$ 71,96	R\$ 4.024,00	55,92	100%	R\$ 4.024,00	55,92	100%	R\$ 4.024,00	0,00	0%	R\$ -
3.5.3	94213 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE ACOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CÁMERO. AF_07/2019	m²	55,92	R\$ 67,41	R\$ 82,55	R\$ 4.616,19	55,92	100%	R\$ 4.616,19	55,92	100%	R\$ 4.616,19	0,00	0%	R\$ -
3.5.4	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,16	R\$ 58,59	R\$ 71,75	R\$ 1.518,23	21,16	100%	R\$ 1.518,23	21,16	100%	R\$ 1.518,23	0,00	0%	R\$ -
3.5.5	101979 SINAPI	CHAFIM (RUFO) CAPA EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	37,51	R\$ 52,23	R\$ 63,96	R\$ 2.399,13	37,51	100%	R\$ 2.399,13	37,51	100%	R\$ 2.399,13	0,00	0%	R\$ -
3.5.6	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,26	R\$ 71,19	R\$ 87,18	R\$ 894,46	10,26	100%	R\$ 894,46	10,26	100%	R\$ 894,46	0,00	0%	R\$ -
3.5.7	91789 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIÓ. AF_10/2015	M	15	R\$ 53,02	R\$ 64,93	R\$ 973,95	15,00	100%	R\$ 973,95	15,00	100%	R\$ 973,95	0,00	0%	R\$ -
3.5.8	89581 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	9	R\$ 35,13	R\$ 43,02	R\$ 387,18	9,00	100%	R\$ 387,18	9,00	100%	R\$ 387,18	0,00	0%	R\$ -
3.5.9	COMP0104	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	55,92	R\$ 84,14	R\$ 103,04	R\$ 5.761,99	55,92	100%	R\$ 5.761,99	55,92	100%	R\$ 5.761,99	0,00	0%	R\$ -
3.5.10	89496 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	55,92	R\$ 31,12	R\$ 38,11	R\$ 2.131,11	55,92	100%	R\$ 2.131,11	55,92	100%	R\$ 2.131,11	0,00	0%	R\$ -
3.5.11	89488 SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	55,92	R\$ 14,17	R\$ 17,35	R\$ 970,21	0,00	0%	R\$ -	55,92	100%	R\$ 970,21	0,00	0%	R\$ -
3.6		PINTURA E ACABAMENTO														
3.6.1	89485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	278,43	R\$ 3,60	R\$ 4,40	R\$ 1.225,09	73,65	26%	R\$ 324,06	204,78	79%	R\$ 913,05	0,00	0%	R\$ -
3.6.2	CP10422	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM E SEM PRESENCIA DE VAZOS	M²	142,03	R\$ 23,38	R\$ 28,63	R\$ 4.066,31	73,65	52%	R\$ 2.108,59	68,38	48%	R\$ 1.957,71	0,00	0%	R\$ -
3.6.3	CP16062	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX (PVA (MASSA CORRIDA) EM PAREDES INTERNAS COM E SEM PRESENCIA DE VAZOS	M²	136,4	R\$ 13,30	R\$ 16,28	R\$ 2.220,59	0,00	0%	R\$ -	136,4	100%	R\$ 2.220,59	0,00	0%	R\$ -
3.6.4	89489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	278,43	R\$ 11,90	R\$ 14,57	R\$ 4.056,72	0,00	0%	R\$ -	278,43	100%	R\$ 4.056,72	0,00	0%	R\$ -
3.7		ESQUADRIAS														
3.7.1	CPU 04	Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	m²	5	R\$ 355,82	R\$ 435,77	R\$ 5.034,37	0,00	0%	R\$ -	5	2%	R\$ 2.352,26	0,00	0%	R\$ -
3.7.2	99823 SINAPI	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	m²	3,57	R\$ 2,35	R\$ 2,87	R\$ 10,24	3,00	60%	R\$ 1.307,31	0,57	0%	R\$ -	2,00	40%	R\$ 871,54
3.7.3	CP 100824	RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM LARGURA MÁXIMA DE 2,00M E=10MM	UN	1	R\$ 93,64	R\$ 114,68	R\$ 114,68	0,00	0%	R\$ -	1	100%	R\$ 114,68	0,00	0%	R\$ -
3.7.4	99695 SINAPI	SOLERA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,6	R\$ 124,97	R\$ 153,05	R\$ 1.163,18	0,00	0%	R\$ -	7,6	100%	R\$ 1.163,18	0,00	0%	R\$ -
3.7.5	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L=15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	7,5	R\$ 170,65	R\$ 208,99	R\$ 1.567,42	5,00	67%	R\$ 1.044,95	2,50	33%	R\$ 522,47	0,00	0%	R\$ -
3.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
3.8.1	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	87,73	R\$ 15,17	R\$ 18,57	R\$ 1.629,14	87,73	100%	R\$ 1.629,14	87,73	100%	R\$ 1.629,14	0,00	0%	R\$ -
3.8.2	72935 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,29	R\$ 10,93	R\$ 13,38	R\$ 84,16	6,29	100%	R\$ 84,16	6,29	100%	R\$ 84,16	0,00	0%	R\$ -
3.8.3	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	73,7	R\$ 2,95	R\$ 3,61	R\$ 266,05	73,70	100%	R\$ 266,05	73,70	100%	R\$ 266,05	0,00	0%	R\$ -
3.8.4	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	127,8	R\$ 4,29	R\$ 5,25	R\$ 670,95	127,80	100%	R\$ 670,95	127,80	100%	R\$ 670,95	0,00	0%	R\$ -
3.8.5	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	87,1	R\$ 6,63	R\$ 8,11	R\$ 706,38	0,00	0%	R\$ -	87,1	100%	R\$ 706,38	0,00	0%	R\$ -
3.8.6	92980 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,2	R\$ 10,36	R\$ 12,68	R\$ 319,53	0,00	0%	R\$ -	25,2	100%	R\$ 319,53	0,00	0%	R\$ -
3.8.7	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 11,70	R\$ 14,32	R\$ 28,64	0,00	0%	R\$ -	2	100%	R\$ 28,64	0,00	0%	R\$ -
3.8.8	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 12,35	R\$ 15,12	R\$ 30,24	0,00	0%	R\$ -	2	100%	R\$ 30,24	0,00	0%	R\$ -
3.8.9	93651 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R\$ 57,83	R\$ 70,82	R\$ 283,28	0,00	0%	R\$ -	4	100%	R\$ 283,28	0,00	0%	R\$ -
3.8.10	93656 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 73,91	R\$ 90,51	R\$ 90,51	0,00	0%	R\$ -	1	100%	R\$ 90,51	0,00	0%	R\$ -
3.8.11	CP 100823	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO AC)	UN	3	R\$ 67,72	R\$ 82,93	R\$ 248,79	0,00	0%	R\$ -	3	100%	R\$ 248,79	0,00	0%	R\$ -
3.8.12	064720 SBC	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIBILIDADE (30mA) BIPOLAR 63A	UN	1	R\$ 252,54	R\$ 309,28	R\$ 309,28	0,00	0%	R\$ -	1	100%	R\$ 309,28	0,00	0%	R\$ -
3.8.13	92027 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	R\$ 67,78	R\$ 83,01	R\$ 83,01	0,00	0%	R\$ -	1	100%	R\$ 83,01	0,00	0%	R\$ -
3.8.14	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	R\$ 49,37	R\$ 60,46	R\$ 483,68	0,00	0%	R\$ -	8	100%	R\$ 483,68	0,00	0%	R\$ -
3.8.15	060121 SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	9	R\$ 85,38	R\$ 104,56	R\$ 941,04	0,00	0%	R\$ -	9	100%	R\$ 941,04	0,00	0%	R\$ -

Proc. nº 428-A
fls. nº 337
CPL



JEAN LIMA
Engenharia Civil
Cadastrado em 08/08/2013
CNPJ nº 16.093.888/0001-08

Atividades em 3D
Projeto em 2D
Projeto Residencial e Comercial
Planta Orçamentária
Documentação
Regulamentação

Obra: REFORMA DO PLENÁRIO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARCIS/RO
Bancos: SINAPI - 06/2023 - RondôniaSBC - 07/2023 - Rondônia
BDI: 22,47%
Encargos: NÃO DESONERADO

PLANILHA DE MEDIÇÃO														
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PRECEDENTE		3ª MEDIÇÃO		REMANESCENTE		
								Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
3.8.16	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	1	R\$ 28,42	R\$ 34,80	R\$ 34,80	0,00	0%	0%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 34,80
3.8.17	97882 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,40x0,40x0,4 M. AF_ 12/2020	UN	1	R\$ 188,03	R\$ 230,28	R\$ 230,28	0,00	0%	0%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 230,28
3.8.18	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1	R\$ 661,32	R\$ 809,91	R\$ 809,91	0,00	0%	0%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 809,91
3.8.19	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017	UN	1	R\$ 141,36	R\$ 173,12	R\$ 173,12	0,00	0%	48%	R\$ 58.714,50	1,00	100%	R\$ 173,12
4		REFORMA PLENÁRIO					R\$ 122.315,64		34%	0%	R\$ -		18%	R\$ 22.256,35
4.1		DEMOLIÇÕES E RETRAÍDAS							100%	0%	R\$ -		0%	R\$ -
4.1.1	022378 SBC	DEMOLUÇÃO MANUAL, DE CONCRETO SIMPLES	m³	3,2	R\$ 171,33	R\$ 209,82	R\$ 1.145,52	3,20	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
4.1.2	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_ 12/2017	m²	55,92	R\$ 1,80	R\$ 2,20	R\$ 123,02	55,92	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
4.1.3	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_ 12/2017	m²	0,15	R\$ 58,36	R\$ 71,47	R\$ 10,72	0,15	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
4.1.4	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	m³	3,12	R\$ 89,08	R\$ 109,09	R\$ 340,36	3,12	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
4.2		EXECUÇÃO DA ESTRUTURA PARA ELEVAÇÃO DOS DEGRÁUS DO PISO					R\$ 27.002,85		71%	0%	R\$ -		29%	R\$ 7.797,11
4.2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	m³	1,1	R\$ 89,08	R\$ 109,09	R\$ 119,99	1,10	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
4.2.2	CPU 27 Próprio	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	36,87	R\$ 144,46	R\$ 176,92	R\$ 6.523,04	26,18	71%	0%	R\$ -	10,69	29%	R\$ 1.891,71
4.2.3	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_ 06/2022	KG	133,47	R\$ 17,16	R\$ 21,01	R\$ 2.804,20	94,76	71%	0%	R\$ -	38,71	29%	R\$ 813,34
4.2.4	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_ 06/2022	KG	208,89	R\$ 16,05	R\$ 19,65	R\$ 4.104,68	148,30	71%	0%	R\$ -	60,59	29%	R\$ 1.190,54
4.2.5	CPU052207 Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETÂNGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES	M²	11,83	R\$ 81,91	R\$ 100,31	R\$ 1.186,66	8,40	71%	0%	R\$ -	3,43	29%	R\$ 344,31
4.2.6	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_ 09/2020	m²	32,2	R\$ 140,06	R\$ 171,53	R\$ 5.523,26	22,86	71%	0%	R\$ -	9,34	29%	R\$ 1.602,09
4.2.7	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	m³	2,87	R\$ 657,16	R\$ 804,82	R\$ 2.309,83	2,04	71%	0%	R\$ -	0,83	29%	R\$ 670,01
4.2.8	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_ 02/2022	m³	2,87	R\$ 298,86	R\$ 366,01	R\$ 1.050,44	2,04	71%	0%	R\$ -	0,83	29%	R\$ 304,70
4.2.9	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 05/2016	m³	34,71	R\$ 79,53	R\$ 97,40	R\$ 3.380,75	24,64	71%	0%	R\$ -	10,07	29%	R\$ 980,41
4.3		PISO					R\$ 63.922,87		23%	67%	R\$ 43.131,98		10%	R\$ 6.361,21
4.3.1	170190 SBC	CAMADA REGULARIZAÇÃO 3,5cm PISO CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5	m²	30,2	R\$ 36,97	R\$ 45,27	R\$ 1.367,15	30,20	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
4.3.2	87373 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_ 08/2019	m²	4,42	R\$ 905,71	R\$ 1.109,22	R\$ 4.902,75	4,42	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
4.3.3	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO AF_ 08/2022	m²	70,77	R\$ 94,15	R\$ 115,30	R\$ 8.159,78	70,77	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
4.3.4	170659 SBC	RODAPE DE PORCELANATO 14,5x90cm MONTE POLIDO BRANCO PORTINARI	m	144,51	R\$ 220,65	R\$ 270,23	R\$ 39.050,93	0,00	0%	84%	R\$ 32.689,72	23,54	16%	R\$ 6.361,21
4.3.5	130925 SBC	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_ 05/2017	m²	72,15	R\$ 118,18	R\$ 144,73	R\$ 10.442,26	0,00	0%	100%	R\$ 10.442,26	0,00	0%	R\$ -
4.4		FORRO					R\$ 15.545,11		42%	43%	R\$ 6.708,98		15%	R\$ 2.272,28
4.4.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_ 05/2017, PS	m²	141,68	R\$ 44,31	R\$ 54,26	R\$ 7.687,55	120,97	85%	0%	R\$ -	20,71	15%	R\$ 1.123,72
4.4.2	88496 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	141,68	R\$ 31,12	R\$ 38,11	R\$ 5.399,42	0,00	0%	85%	R\$ 4.610,16	20,71	15%	R\$ 789,25
4.4.3	88498 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_ 04/2023	m²	141,68	R\$ 14,17	R\$ 17,35	R\$ 2.458,14	0,00	0%	85%	R\$ 2.098,82	20,71	15%	R\$ 359,31
4.5		PINTURA					R\$ 1.846,15		0%	85%	R\$ 1.577,53		15%	R\$ 268,62
4.5.1	CP016062 Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA (MASSA CORRIDA) EM PAREDES INTERNAS COM E SEM PRESEÇA DE VAOS	M²	113,4	R\$ 13,30	R\$ 16,28	R\$ 1.846,15	0,00	0%	85%	R\$ 1.577,53	16,50	15%	R\$ 268,62
4.6		ACABAMENTOS E OUTROS					R\$ 12.853,14		0%	57%	R\$ 7.298,01		43%	R\$ 5.557,13
4.6.1	101966 SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020	M	5,7	R\$ 222,55	R\$ 272,55	R\$ 1.553,53	0,00	0%	0%	R\$ -	5,70	100%	R\$ 1.553,53
4.6.2	111085 SBC	PORTÃO FERRO PERFIL TUBULAR 2" GRADE 1,0x0,80m	UN	2	R\$ 1.055,39	R\$ 1.292,53	R\$ 2.585,06	0,00	0%	0%	R\$ -	2,00	100%	R\$ 2.585,06
4.6.3	111607 SBC	CORRIMÃO INOX 304 COM VIDRO	M	3,8	R\$ 304,81	R\$ 373,30	R\$ 1.418,54	0,00	0%	0%	R\$ -	3,80	100%	R\$ 1.418,54
4.6.4	J04 Próprio	MARMORATO EM PAREDES DE ALVENARIA	m²	23,31	R\$ 154,77	R\$ 189,54	R\$ 4.418,17	0,00	0%	100%	R\$ 4.418,17	0,00	0%	R\$ -
4.6.5	104658 SINAPI	PISO PORTATIL DE ALTA RESISTÊNCIA DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2023	m²	10,5	R\$ 223,80	R\$ 274,08	R\$ 2.877,84	0,00	0%	100%	R\$ 2.877,84	0,00	0%	R\$ -
5		DEMOLIÇÃO DE BANHEIRO PARA AMPLIAÇÃO DE SALA					R\$ 5.806,45		55%	0%	R\$ -		45%	R\$ 2.625,93
5.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	m²	1,25	R\$ 58,36	R\$ 71,47	R\$ 89,33	1,25	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
5.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	m²	1,47	R\$ 9,32	R\$ 11,41	R\$ 16,77	1,47	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
5.3	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	UN	2	R\$ 12,32	R\$ 15,08	R\$ 30,16	2,00	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
5.4	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	m²	0,64	R\$ 35,13	R\$ 43,02	R\$ 27,53	0,64	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
5.5	CP 100825 Próprio	RETRADA DE ENTULHO DE FORMA MANUAL, COM CARRINHO DE MÃO	M³	1,87	R\$ 8,58	R\$ 10,50	R\$ 19,63	1,87	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
5.6	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	m²	8,2	R\$ 1,80	R\$ 2,20	R\$ 18,04	8,20	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
5.7	170303 SBC	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPIÇOS	M	4,1	R\$ 36,52	R\$ 44,72	R\$ 183,35	4,10	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
5.8	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	m²	8,2	R\$ 23,26	R\$ 28,48	R\$ 233,53	8,20	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -
5.9	CP 100826 Próprio	TAMPONAMENTO DE CONEXÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1	R\$ 51,21	R\$ 62,71	R\$ 62,71	1,00	100%	0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -

Município de Alto Alegre dos Parecis
P.º nº 358
CPL

Maquetes em 3D

Projeto para Casa

Projeto Residência e Comercial

Projeto Orçamentário

Regularização

JEAN LIMA

Engenheiro Civil, CREA 12781/PA

Engenheiro de Obras, CREA 12781/PA

CERNI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DA REGIÃO NOROCCIDENTAL DO PARÁ

Obra: REFORMA DO PLENÁRIO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Bancos: SINAPI - 06/2023 - RondôniaSBC - 07/2023 - Rondônia

BDI: 22,47%

Encargos: NÃO DESONERADO

PLANILHA DE MEDIÇÃO										PRECEDENTE			3ª MEDIÇÃO			REMANESCENTE		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Quant.	(%)	Valor	Quant.	(%)	Valor	Quant.	(%)	Valor	
5.10	CPU052202	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	0,64	R\$ 115,54	R\$ 141,50	R\$ 90,56	0,64	100%	R\$ 90,56		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	
5.11	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,35	R\$ 573,40	R\$ 702,24	R\$ 245,78	0,35	100%	R\$ 245,78		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	
5.12	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2,8	R\$ 26,42	R\$ 32,35	R\$ 90,58	2,80	100%	R\$ 90,58		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	
5.13	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017. PS	m²	8,2	R\$ 86,71	R\$ 106,19	R\$ 870,75	8,20	100%	R\$ 870,75		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	
5.14	CP016062	Próprio	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LATEX PVA (MASSA CORRIDA) EM PAREDES INTERNAS COM E SEM PRESENCIA DE VÁZIOS	M²	18,3	R\$ 13,30	R\$ 16,28	R\$ 297,92	18,30	100%	R\$ 297,92		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	
5.15	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014.	m²	12,3	R\$ 11,90	R\$ 14,57	R\$ 179,21	12,30	100%	R\$ 179,21		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	
5.16	96955	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,1	R\$ 124,97	R\$ 153,05	R\$ 627,50	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	4,10	100%	R\$ 627,50	
5.17	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023. PE	m²	8,2	R\$ 123,74	R\$ 151,54	R\$ 1.242,62	4,10	50%	R\$ 621,31		0%	R\$ -	4,10	50%	R\$ 621,31	
5.18	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	4,1	R\$ 20,59	R\$ 25,21	R\$ 103,36	4,10	100%	R\$ 103,36		0%	R\$ -	0,00	0%	R\$ -	
5.19	J04	Próprio	MARMORATO EM PAREDES DE ALVENARIA	M²	6	R\$ 154,77	R\$ 189,54	R\$ 1.137,24	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	6,00	100%	R\$ 1.137,24	
5.20	060914	SBC	SPOT TRILHO TRIPLO VALENCIA HUNTER TRADE PRETO 3 DICROICAS	UN	1	R\$ 195,87	R\$ 239,88	R\$ 239,88	0,00	0%	R\$ -		0%	R\$ -	1,00	100%	R\$ 239,88	
Total sem BDI								R\$ 243.891,61			R\$ 140.796,84			R\$ 71.348,68			R\$ 31.746,10	
Total do BDI								R\$ 54.775,74			R\$ 31.621,63			R\$ 16.024,23			R\$ 7.129,87	
Total Geral								R\$ 298.667,35			R\$ 172.418,47			R\$ 87.372,91			R\$ 38.875,97	
(oitenta e sete mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e um centavo)																		

OBS: 1ª medição: Item 2.1 e 2.3 glosa parcial em razão da execução parcial do item, Item 3.1.4 glosa total do item em razão da ausência de sua execução o desempenho nem tão pouco o funcionamento da edificação

dade, sendo assim poderão ser recebidos parcialmente

