



L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 14.372.416/0001-45

SOLICITAÇÃO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO

Modalidade Tomada de Preços nº 1/2022.

(Processo Administrativo nº 129/2022)

Contrato nº 3/2022



Objeto: Contratação de Empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção do almoxarifado, garagem e adequações e reforma do prédio onde situa a sede da Câmara Municipal de Alto Alegre dos Parecis, nos moldes do projeto elaborado pela câmara., sediada na Rua Afonso Pena, 3951 Centro de Alto Alegre dos Parecis RO.

A Empresa **L. P. M. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 14.372.416/0001-45. Vem através desta solicitar A PRIMEIRA MEDIÇÃO. Conforme diário de obra e relatório fotográfico.

Aguardando deferimento.

Nova Brasilândia D'Oeste/RO, 22 de outubro de 2022.

LPM PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA - 14.372.416/0001-45

Jose Antônio Castro Eugenio/Socio

CPF: 580.970.901-04 - RG: 0927738-2 SSP-MT

RECEBI EM
24/10/2022

Marco Antonio R. da Silva
Diretor de Orçamento e Finanças
Port. 003/CMA/12.2019

Av.13 de maio nº 2297, Centro Nova Brasilândia D'Oeste - RO

(69) 3418-2655 – 99996-2306 – 98469-3317

E-mail: friagemarcondicionado@hotmail.com



TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
1ª medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ALMOXARIFADO, GARAGEM E ADEQUAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE SITUA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARCISRO, NOS MOLDES DO PROJETO ELABORADO PELA CAMARA MUNICIPAL.

Bancos
SINAPI -
05/2022 -
Rondônia
SBC - 06/2022 -
Rondônia

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com
as bases.

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					7.951,75	15,70 %	
1.1	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.018,07	4.920,93	4.920,93	9,71 %	
1.2	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26	95,19	116,57	3.030,82	5,98 %	
2		CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO, DEPÓSITO E GARAGEM					42.706,75	84,30 %	
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					7.335,41	14,48 %	
2.1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	406,35	497,65	2.985,90	5,89 %	
2.1.2	C02 AFO	TAXAS E EMOLUMENTOS	TX	1	224,82	275,33	275,33	0,54 %	
2.1.3	Próprio CPU0522/06	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M²	6	554,45	679,03	4.074,18	8,04 %	
2.2		COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS							
2.2.1	97625 SINAPI	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					0,00	0,00 %	
2.2.1	97625 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0	51,55	63,13	0,00	0,00 %	
2.2.2	CP01606/1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	M3XKM	0	8,08	9,89	0,00	0,00 %	
2.2.3	93588 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0	3,00	3,67	0,00	0,00 %	
2.3		INFRAESTRUTURA					35.371,34	69,82 %	
2.3.1	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	69,43	46,13	56,49	3.922,10	7,74 %	
2.3.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,07	77,26	94,62	1.615,16	3,19 %	
2.3.3	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	11,2	30,99	37,95	425,04	0,84 %	
2.3.5	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	114,46	21,52	26,35	3.016,02	5,95 %	
2.3.6	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,63	20,65	25,29	15,93	0,03 %	
2.3.7	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	131,31	19,63	24,04	3.156,69	6,23 %	
2.3.7	COMP 687	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X24 CM	M²	28,17	79,00	96,75	2.725,44	5,38 %	
2.3.8	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	133,11	17,68	21,65	2.881,83	5,69 %	
2.3.9	96547 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	161,47	15,00	18,37	2.966,20	5,86 %	
2.3.10	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	48,29	59,66	73,06	3.528,06	6,96 %	
2.3.11	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,87	564,53	691,37	4.058,34	8,01 %	
2.3.12	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	5,87	260,09	318,53	1.869,77	3,69 %	
2.3.13	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	105,14	40,32	49,37	5.190,76	10,25 %	
2.4		SUPERESTRUTURA					0,00	0,00 %	
2.4.1	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0	21,52	26,35	0,00	0,00 %	
2.4.2	92776 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0	20,65	25,29	0,00	0,00 %	
2.4.3	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0	19,59	23,99	0,00	0,00 %	
2.4.4	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0	17,59	21,54	0,00	0,00 %	
2.4.5	92779 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0	14,86	18,19	0,00	0,00 %	
2.4.6	92448 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	0	118,56	145,20	0,00	0,00 %	
2.4.7	Próprio CPU0522/04	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	0	106,42	130,33	0,00	0,00 %	
2.4.8	92482 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	0	232,99	285,34	0,00	0,00 %	
2.4.9	101792 SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	0	12,53	15,34	0,00	0,00 %	



2.4.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0	564,53	691,37	0,00	0,00 %
2.4.11	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0	260,09	318,53	0,00	0,00 %
2.4.12	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0	72,06	88,25	0,00	0,00 %
2.4.13	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0	70,28	86,07	0,00	0,00 %
2.4.14	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0	64,99	79,59	0,00	0,00 %
2.5			PAREDES E PAINÉIS					0,00	0,00 %
2.5.1	CP-875	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	0	126,60	155,04	0,00	0,00 %
2.5.2	CPU0522/02	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	0	103,08	126,24	0,00	0,00 %
2.5.3	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0	6,59	8,07	0,00	0,00 %
2.5.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0	22,50	27,55	0,00	0,00 %
2.6			PISO E PAVIMENTAÇÃO					0,00	0,00 %
2.6.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	0	87,18	106,76	0,00	0,00 %
2.6.2	CPU- C84191	Próprio	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	0	147,29	180,38	0,00	0,00 %
2.6.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	0	120,84	147,99	0,00	0,00 %
2.6.4	130324	SBC	RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	M	0	43,14	52,83	0,00	0,00 %
2.6.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	0	854,72	1.046,77	0,00	0,00 %
2.6.6	CPU 27	Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	0	121,48	148,77	0,00	0,00 %
2.7			FORRO E COBERTURA					0,00	0,00 %
2.7.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	0	90,35	110,65	0,00	0,00 %
2.7.2	92608	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	0	1.353,86	1.658,07	0,00	0,00 %
2.7.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	0	59,06	72,33	0,00	0,00 %
2.7.4	100369	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0	1.107,26	1.356,06	0,00	0,00 %
2.7.5	100371	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	0	1.505,76	1.844,10	0,00	0,00 %
2.7.6	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	0	15,70	19,22	0,00	0,00 %
2.7.7	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	0	48,23	59,06	0,00	0,00 %
2.7.8	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0	58,67	71,85	0,00	0,00 %
2.7.9	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	0	54,03	66,17	0,00	0,00 %
2.7.10	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0	72,62	88,93	0,00	0,00 %
2.7.11	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	0	52,62	64,44	0,00	0,00 %
2.7.12	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0	31,54	38,62	0,00	0,00 %



2.7.13	89566	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	0	52,07	63,77	0,00	0,00 %
2.8			PINTURA E ACABAMENTO					0,00	0,00 %
2.8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	0	2,20	2,69	0,00	0,00 %
2.8.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	0	14,60	17,88	0,00	0,00 %
2.8.3	CP10422	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÊX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM E SEM PRESENÇA DE VÃOS	M²	0	20,37	24,94	0,00	0,00 %
2.8.4	CP01606/2	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÊX PVA (MASSA CORRIDA) EM PAREDES INTERNAS COM E SEM PRESENÇA DE VÃOS	M²	0	11,58	14,18	0,00	0,00 %
2.8.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	0	17,05	20,88	0,00	0,00 %
2.9			ESQUADRIAS					0,00	0,00 %
2.9.1	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0	862,10	1.055,81	0,00	0,00 %
2.9.2	CPU 04 AAP	Próprio	Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e Instalação	M²	0	358,19	438,67	0,00	0,00 %
2.9.3	110014	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00x2,10m	UN	0	1.219,42	1.493,42	0,00	0,00 %
2.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					0,00	0,00 %
2.10.1	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	12,62	15,45	0,00	0,00 %
2.10.2	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0	9,48	11,61	0,00	0,00 %
2.10.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	2,94	3,60	0,00	0,00 %
2.10.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	4,28	5,24	0,00	0,00 %
2.10.5	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	11,84	14,50	0,00	0,00 %
2.10.6	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0	12,13	14,85	0,00	0,00 %
2.10.7	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0	66,02	80,85	0,00	0,00 %
2.10.8	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0	27,60	33,80	0,00	0,00 %
2.10.9	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0	61,63	75,47	0,00	0,00 %
2.10.10	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0	46,34	56,75	0,00	0,00 %
2.10.11	060121	SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	0	75,49	92,45	0,00	0,00 %
2.10.12	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0	30,92	37,86	0,00	0,00 %
2.10.13	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0	510,46	625,16	0,00	0,00 %
2.10.14	064720	SBC	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A	UN	0	281,50	344,75	0,00	0,00 %
2.10.15	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	0	181,07	221,75	0,00	0,00 %
2.11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					0,00	0,00 %
2.11.1	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0	41,22	50,48	0,00	0,00 %
2.11.2	73639	SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90° ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0	18,37	22,49	0,00	0,00 %
2.11.3	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0	5,98	7,32	0,00	0,00 %
2.11.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0	21,75	26,63	0,00	0,00 %
3			CONSTRUÇÃO DO MURO					0,00	0,00 %
3.1	CP022824	Próprio	VIGA CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 5,00MM COM DIMENSÕES DE 26CMX14XCM EM CONCRETO 25MPA	M	0	92,40	113,16	0,00	0,00 %
3.2	CPU0522/08	Próprio	PILAR EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCK DE 20MPA	M	0	56,57	69,28	0,00	0,00 %
3.3	CPU0522/02	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	0	103,08	126,24	0,00	0,00 %
3.4	CPU0522/07	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	0	73,72	90,28	0,00	0,00 %



3.5	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0	6,59	8,07	0,00	0,00 %
3.6	CPU 27 Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	0	121,48	148,77	0,00	0,00 %
3.7	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0	77,26	94,62	0,00	0,00 %
4		ACESSIBILIDADE					0,00	0,00 %
4.1	101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	0	161,25	197,48	0,00	0,00 %
4.2	202104 SBC	PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)	M	0	248,03	303,76	0,00	0,00 %
4.3	202102 SBC	PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	M	0	208,30	255,10	0,00	0,00 %
4.4	022140 SBC	DEMOLICAO CONCRETO SIMPLES ATE 0,5M3	m²	0	57,72	70,68	0,00	0,00 %
4.5	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	0	854,72	1.046,77	0,00	0,00 %
5		ADEQUAÇÃO COZINHA					0,00	0,00 %
5.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0	50,58	61,94	0,00	0,00 %
5.2	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0	20,14	24,66	0,00	0,00 %
5.3	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0	8,07	9,88	0,00	0,00 %
5.4	87262 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	0	163,15	199,80	0,00	0,00 %
5.5	98689 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0	117,66	144,09	0,00	0,00 %
5.6	1 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM)	m²	0	119,67	146,55	0,00	0,00 %
5.7	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	0	6,59	8,07	0,00	0,00 %
5.8	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0	22,50	27,55	0,00	0,00 %
5.9	180783 SBC	PINTURA EPOXY 2 DEMAOS COM MASSA	m²	0	63,15	77,33	0,00	0,00 %

Total sem BDI	41.366,70
Total do BDI	9.291,80
Total Geral	50.658,50


Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000002
	Dias Decorridos: 4	Data: 19/09/2022 (Segunda-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 88	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
ENCARREGADO GERAL	


 Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA: 17630 D/RO


 Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000002
	Dias Decorridos: 5	Data: 20/09/2022 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 87	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecís - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	


Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 	
--	--


Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 17650 D/RO


 Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000003
	Dias Decorridos: 6	Data: 21/09/2022 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 86	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	

Relatório Diário de Obra


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 	
--	--


 Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA: 17650 D/RO


 Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO



Dias Contratuais: 92

RDO: 00000004

Dias Decorridos: 7

Data: 22/09/2022 (Quinta-Feira)

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Dias para Terminar: 85

Início: 16/09/2022

Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000

Termino Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA



Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 17650 D/RO

Responsável Técnico

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000005
	Dias Decorridos: 8	Data: 23/09/2022 (Sexta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 84	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 	


Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 17650 D/RO


 Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000006
	Dias Decorridos: 11	Data: 26/09/2022 (Segunda-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 81	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	

Relatório Diário de Obra


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 	ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 


 Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA: 17650 D/RO


 Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000007
	Dias Decorridos: 12	Data: 27/09/2022 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 80	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	0.0		nenhum	
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos


LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -



LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -




 Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA: 17650 D/RO


 Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 10517D-RO

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000008
	Dias Decorridos: 13	Data: 28/09/2022 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 79	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	


Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	0.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos




 Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA: 17650 D/RO


 Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000009
	Dias Decorridos: 14	Data: 29/09/2022 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Término: 78	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Término Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		



Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	0.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos


ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA



Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 17650 D/RO

Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

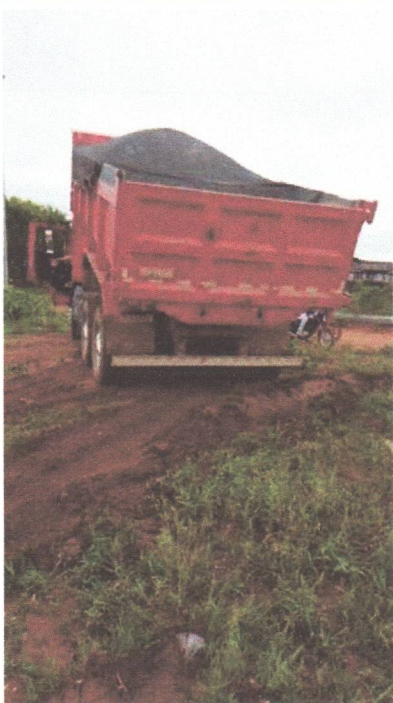
	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000010
	Dias Decorridos: 15	Data: 30/09/2022 (Sexta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 77	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecís - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		




Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Galeria de Fotos

TRANSPORTE MATERIAIS 	TRANSPORTE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 
--	--


 Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA: 17630 D/RO


 Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000011
	Dias Decorridos: 18	Data: 03/10/2022 (Segunda-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 74	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos




 Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 17650 D/RO


 Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000012
	Dias Decorridos: 19	Data: 04/10/2022 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 73	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecís - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS



Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA: 17650 D/RO

Responsável Técnico
Joel Favares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000013
	Dias Decorridos: 20	Data: 05/10/2022 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 72	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS 	ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS 
---	--


 Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA: 17650 D/RO


 Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

Dias Contratuais: 92

RDO: 00000014

Dias Decorridos: 21

Data: 06/10/2022 (Quinta-Feira)

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Dias para Terminar: 71

Início: 16/09/2022

Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000

Termino Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS



ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS



Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 17650 D/RO

Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO



Dias Contratuais: 92

RDO: 00000015

Dias Decorridos: 22

Data: 07/10/2022 (Sexta-Feira)

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Dias para Terminar: 70

Início: 16/09/2022

Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000

Termino Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

ARMAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES



Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 17650 D/RO

Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0.0		nenhum	


Galeria de Fotos

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA E ALVENARIA



ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA E ALVENARIA




Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 17650 D/RO


Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000017
	Dias Decorridos: 26	Data: 11/10/2022 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 66	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra



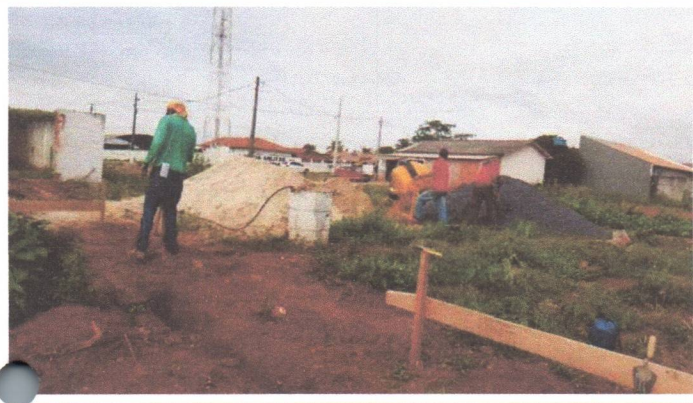
Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	0.0		nenhum	
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0.0		nenhum	
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0.0		nenhum	


Galeria de Fotos


VIGAS BALDRAME



SAPATAS




 Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA: 17650 D/RO


 Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0.0		nenhum	
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0.0		nenhum	
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X24 CM	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

VIGAS BALDRAME



VIGAS BALDRAME



Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 17650 D/RO

Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0.0		nenhum	
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0.0		nenhum	
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X24 CM	0.0		nenhum	


Galeria de Fotos

ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS



ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS




 Jean Pablo Oliveira de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA: 17650 D/RO


 Responsável Técnico
 Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO



Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000020
	Dias Decorridos: 32	Data: 17/10/2022 (Segunda-Feira)
	Dias para Terminar: 60	Início: 16/09/2022
		Termino Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ GRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0.0		nenhum	
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0.0		nenhum	
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X24 CM	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS	VIGAS BALDRAME

fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 17650 D/RO

Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

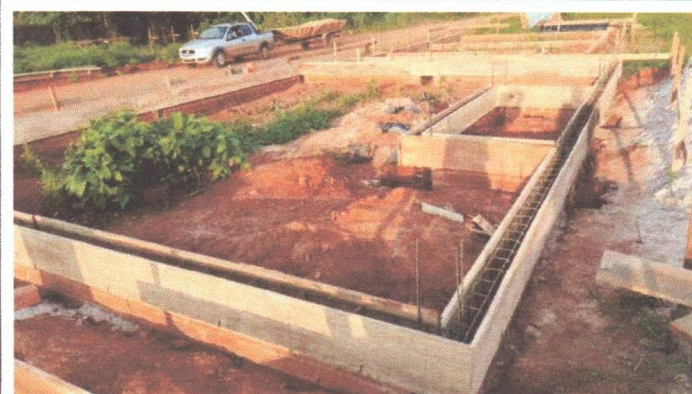
Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0.0		nenhum	
ENCANAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0.0		nenhum	
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X24 CM	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

VIGAS BALDRAME



VIGAS BALDRAME



Fiscal

Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 17650 D/RO

Responsável Técnico

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO



Dias Contratuais: 92

RDO: 00000022

Dias Decorridos: 34

Data: 19/10/2022 (Quarta-feira)

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Dias para Terminar: 58

Início: 16/09/2022

Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000

Termino Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra



Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0.0		nenhum	
ACABAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	0.0		nenhum	
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X14X24 CM	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

VIGAS BALDRAME



VIGAS BALDRAME



Fiscal
Jean Pablo Oliveira de Lima
Engenheiro Civil
CREA: 17650 D/RO

Responsável Técnico
Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO
