




L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 14.372.416/0001-45

Ofício 003/2022

SOLICITAÇÃO DA TERCEIRA MEDIÇÃO

CONTRATO N° 003/2022



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ALMOXARIFADO, GARAGEM E ADEQUAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE SITUA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, NOS MOLDES DO PROJETO ELABORADO PELA CAMARA MUNICIPAL.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS – RO CNPJ 01.640.319/0001-44, situada na Av. Afonso Pena, 3951, Cento de Alto Alegre dos Parecis RO, neste ato representado pelo seu presidente, VALMIRO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, portador do CPF.: 409.019.632-91.

A Empresa **L. P. M. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 14.372.416/0001-45. Vem através desta solicitar **A TERCEIRA MEDIÇÃO**. Conforme os anexos do diário de obra e relatório fotografico, do objeto citado acima.

Aguardando deferimento.

Nova Brasilândia D'Oeste/RO, 19 de dezembro de 2022.


José A.C. Eugênio

LPM PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA –
14.372.416/0001-45

Av. 13 de maio, 2297, Centro Nova Brasilândia D'Oeste - RO

(69) 3418-2655 – 99996-2306 – 98469-3317

E-mail: friagemarcondicionado@hotmail.com



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ALMOXARIFADO, GARAGEM E ADEQUAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE SITUA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO.

Planilha de Levantamento para Medição

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 19/10/2022	2ª Medição 18/11/2022	3ª Medição 21/12/2022
1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					23.855,25	R\$ 6.436,34	R\$ 6.436,34	R\$ 5.491,28
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,0	2,5	83,33%	12.302,32	14.762,79	R\$ 4.920,93	R\$ 4.920,93	R\$ 2.460,46
							33,33%	33,33%	16,67%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	78,0	52,0	66,67%	6.061,64	9.092,46	R\$ 1.515,41	R\$ 1.515,41	R\$ 3.030,82
							16,67%	16,67%	33,33%
2	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO, DEPÓSITO E GARAGEM					258.712,11	R\$ 49.108,69	R\$ 72.240,78	R\$ 54.444,08
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					7.335,41	R\$ 7.335,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
							100,00%	0,00%	0,00%
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,0	6,0	100,0%	2.985,90	2.985,90	R\$ 2.985,90		
							100,00%		
2.1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	1,0	1,0	100,0%	275,33	275,33	R\$ 275,33		
							100,00%		
2.1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	6,0	6,0	100,0%	4.074,18	4.074,18	R\$ 4.074,18		
							100,00%		
2.2	COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS					1.512,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						0,00%	0,00%	0,00%
2.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,29	0,0	0,0%	0,00	649,60			
2.2.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	18,52	0,0	0,0%	0,00	183,16			
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	185,2	0,0	0,0%	0,00	679,68			
2.3	INFRAESTRUTURA					35.371,34	R\$ 34.481,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
							97,48%	0,00%	0,00%
2.3.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	69,43	69,43	100,0%	3.922,10	3.922,10	R\$ 3.922,10		
							100,00%		
2.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	17,07	17,07	100,0%	1.615,16	1.615,16	R\$ 1.615,16		
							100,00%		
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	11,2	11,2	100,0%	425,04	425,04	R\$ 425,04		
							100,00%		
2.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	114,46	114,46	100,0%	3.016,02	3.016,02	R\$ 3.016,02		
							100,00%		
2.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0,63	0,63	100,0%	15,93	15,93	R\$ 15,93		
							100,00%		
2.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	131,31	131,31	100,0%	3.156,69	3.156,69	R\$ 3.156,69		
							100,00%		
2.3.7	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO CERÂMICO FURADO 9X14X24 CM	28,17	28,17	100,0%	2.725,44	2.725,44	R\$ 2.725,44		
							100,00%		
2.3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	133,11	133,11	100,0%	2.881,83	2.881,83	R\$ 2.881,83		
							100,00%		
2.3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	161,47	113,03	70,0%	2.076,36	2.966,20	R\$ 2.076,36		
							70,00%		
2.3.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	48,29	48,29	100,0%	3.528,06	3.528,06	R\$ 3.528,06		
							100,00%		
2.3.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	5,87	5,87	100,0%	4.058,34	4.058,34	R\$ 4.058,34		
							100,00%		
2.3.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	5,87	5,87	100,0%	1.869,77	1.869,77	R\$ 1.869,77		
							100,00%		
2.3.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	105,14	105,14	100,0%	5.190,76	5.190,76	R\$ 5.190,76		
							100,00%		
2.4	SUPERESTRUTURA					54.511,30	R\$ 0,00	R\$ 49.886,79	R\$ 0,00
							0,00%	91,51%	0,00%
2.4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	220,86	220,86	100,0%	5.819,66	5.819,66		R\$ 5.819,66	
								100,00%	
2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	8,37	8,37	100,0%	211,67	211,67		R\$ 211,67	
								100,00%	
2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	189,09	189,09	100,0%	4.536,26	4.536,26		R\$ 4.536,26	
								100,00%	
2.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	284,85	257,0	90,22%	5.535,78	6.135,66		R\$ 5.535,78	
								90,22%	
2.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	45,27	45,27	100,0%	823,46	823,46		R\$ 823,46	
								100,00%	



2.4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	104,08	90,0	86,47%	13.068,00	15.112,41		R\$ 13.068,00	86,47%		
2.4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	68,22	60,0	87,95%	7.819,80	8.891,11		R\$ 7.819,80	87,95%		
2.4.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	5,92	5,92	100,0%	1.689,21	1.689,21		R\$ 1.689,21	100,00%		
2.4.9	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	5,92	5,92	100,0%	90,81	90,81		R\$ 90,81	100,00%		
2.4.10	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	9,2	8,3	90,22%	5.738,37	6.360,60		R\$ 5.738,37	90,22%		
2.4.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	9,2	8,3	90,22%	2.643,79	2.930,47		R\$ 2.643,79	90,22%		
2.4.12	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	8,4	8,4	100,0%	741,30	741,30		R\$ 741,30	100,00%		
2.4.13	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	8,4	8,4	100,0%	722,98	722,98		R\$ 722,98	100,00%		
2.4.14	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5,6	5,6	100,0%	445,70	445,70		R\$ 445,70	100,00%		
2.5	PAREDES E PAINÉIS				40.905,64		R\$ 7.291,78	R\$ 20.989,60		R\$ 0,00	
2.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	65,95	65,95	100,0%	10.224,88	10.224,88	R\$ 17,82%	R\$ 20.989,60	51,31%		0,00%
2.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	117,42	117,42	100,0%	14.823,10	14.823,10	R\$ 24,64	R\$ 6.404,70	41,31%		
2.5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	445,19	400,67	90,0%	3.233,40	3.592,68	R\$ 37,36%	R\$ 6.404,70	62,64%		
2.5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	445,19	0,0	0,0%	0,00	12.264,98					
2.6	PISO E PAVIMENTAÇÃO				29.413,52		R\$ 0,00	R\$ 1.364,39		R\$ 14.039,98	
2.6.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	25,56	25,48	99,69%	2.720,24	2.728,78	R\$ 0,00%	R\$ 4,63%		R\$ 47,73%	
2.6.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	77,55	0,0	0,0%	0,00	13.988,46		R\$ 12,78		R\$ 12,7	
2.6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	50,23	50,23	100,0%	7.433,53	7.433,53		R\$ 1.364,39		R\$ 1.355,85	
2.6.4	RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	50,23	50,0	99,54%	2.641,50	2.653,65		R\$ 50,00%		R\$ 49,69%	
2.6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1,6	1,6	100,0%	1.674,83	1.674,83					
2.6.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	6,28	6,28	100,0%	934,27	934,27					
2.7	FORRO E COBERTURA				54.595,92		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 40.404,10	
2.7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	127,78	0,0	0,0%	0,00	14.138,85					
2.7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	3,0	3,0	100,0%	4.974,21	4.974,21					
2.7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	50,23	50,23	100,0%	3.633,13	3.633,13					
2.7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	2,0	2,0	100,0%	2.712,12	2.712,12					
2.7.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	4,0	4,0	100,0%	7.376,40	7.376,40					
2.7.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	78,36	78,0	99,54%	1.499,16	1.506,07					
2.7.7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	127,78	127,0	99,39%	7.500,62	7.546,68					
2.7.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	36,48	36,48	100,0%	2.621,08	2.621,08					



2.7.9	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	74,06	74,06	100,0%	4.900,55	4.900,55				
2.7.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	20,1	20,1	100,0%	1.787,49	1.787,49				
2.7.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	45,17	45,17	100,0%	2.910,75	2.910,75				
2.7.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	11,0	11,0	100,0%	424,82	424,82				
2.7.13	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	1,0	1,0	100,0%	63,77	63,77				
2.8	PINTURA E ACABAMENTO					19.009,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	445,19	0,0	0,0%	0,00	1.197,56				
2.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	445,19	0,0	0,0%	0,00	7.959,99				
2.8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM E SEM PRESENÇA DE VÃOS	305,87	0,0	0,0%	0,00	7.628,39				
2.8.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATÉX PVA (MASSA CORRIDA) EM PAREDES INTERNAS COM E SEM PRESENÇA DE VÃOS	139,32	0,0	0,0%	0,00	1.975,55				
2.8.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	11,86	0,0	0,0%	0,00	247,63				
2.9	ESQUADRIAS					5.359,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,0	0,0	0,0%	0,00	2.111,62				
2.9.2	Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	4,0	0,0	0,0%	0,00	1.754,68				
2.9.3	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,00x2,10m	1,0	0,0	0,0%	0,00	1.493,42				
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					9.161,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.10.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,11	0,0	0,0%	0,00	63,49				
2.10.2	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	171,79	0,0	0,0%	0,00	1.994,48				
2.10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	107,19	0,0	0,0%	0,00	385,88				
2.10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	233,0	0,0	0,0%	0,00	1.220,92				
2.10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	141,14	0,0	0,0%	0,00	2.046,53				
2.10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,0	0,0	0,0%	0,00	59,40				
2.10.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00	80,85				
2.10.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,0	0,0	0,0%	0,00	338,00				
2.10.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,0	0,0	0,0%	0,00	75,47				
2.10.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,0	0,0	0,0%	0,00	113,50				
2.10.11	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	14,0	0,0	0,0%	0,00	1.294,30				
2.10.12	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	75,72				
2.10.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00	625,16				
2.10.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB (30mA) BIPOLAR 63A	1,0	0,0	0,0%	0,00	344,75				
2.10.15	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	443,50				
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1.535,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.11.1	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	100,96				
2.11.2	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,0	0,0	0,0%	0,00	44,98				
2.11.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,0	0,0	0,0%	0,00	14,64				
2.11.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	51,64	0,0	0,0%	0,00	1.375,17				
3	CONSTRUÇÃO DO MURO					27.000,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.1	VIGA CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 5,00MM COM DIMENSÕES DE 26CMX14XCM EM CONCRETO 25MPA	40,53	0,0	0,0%	0,00	4.586,37				
3.2	PILAR EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCK DE 20MPA	52,5	0,0	0,0%	0,00	3.637,20				
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	105,0	0,0	0,0%	0,00	13.255,20				

3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	21,0	0,0	0,0%	0,00	1.895,88			
3.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	225,65	0,0	0,0%	0,00	1.820,99			
3.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	10,53	0,0	0,0%	0,00	1.566,54			
3.7	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	2,52	0,0	0,0%	0,00	238,44			
4	ACESSIBILIDADE					23.083,34	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
4.1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	43,2	0,0	0,0%	0,00	8.531,13			
4.2	PISO TÁTIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)	18,6	0,0	0,0%	0,00	5.649,93			
4.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	28,4	0,0	0,0%	0,00	7.244,84			
4.4	DEMOLICAÇÃO CONCRETO SIMPLES ATÉ 0,5M3	8,64	0,0	0,0%	0,00	610,67			
4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1,0	0,0	0,0%	0,00	1.046,77			
5	ADEQUAÇÃO COZINHA					5.887,52	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 435,72 7,40%	R\$ 0,00 0,00%
5.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,86	0,86	100,0%	53,26	53,26		0,86 R\$ 53,26 100,00%	
5.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,36	0,0	0,0%	0,00	255,47			
5.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,68	1,68	100,0%	16,59	16,59		1,68 R\$ 16,59 100,00%	
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	10,36	0,0	0,0%	0,00	2.069,92			
5.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	0,8	0,0	0,0%	0,00	115,27			
5.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM)	1,69	1,68	99,41%	246,20	247,66		1,68 R\$ 246,20 99,41%	
5.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	3,36	3,36	100,0%	27,11	27,11		3,36 R\$ 27,11 100,00%	
5.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	3,36	3,36	100,0%	92,56	92,56		3,36 R\$ 92,56 100,00%	
5.9	PINTURA EPOXY 2 DEMASOS COM MASSA	38,92	0,0	0,0%	0,00	3.009,68			

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico

Porcentagem Executada	16,41%	23,37%	17,70%
Valor Executado	R\$ 55.545,03	R\$ 79.112,84	R\$ 59.935,36
Porcentagem Acumulada	16,41%	39,78%	57,48%
Valor Executado Acumulado	R\$ 55.545,03	R\$ 134.657,87	R\$ 194.593,23
Saldo Total			143.945,61





Dias Contratuais: 92

RDO: 00000043

Dias Decorridos: 67

Data: 21/11/2022 (Segunda-Feira)

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Dias para Terminar: 25

Início: 16/09/2022

Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000

Termino Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos

CHAPISCO



Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000044
	Dias Decorridos: 68	Data: 22/11/2022 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 24	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	


Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos

CHAPISCO



Fiscal


 Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000045
	Dias Decorridos: 69	Data: 23/11/2022 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 23	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	0.0	m²	nenhum	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
CHAPISCO 	

Fiscal


 Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

 Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000046
	Dias Decorridos: 70	Data: 24/11/2022 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 22	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ATERRAMENTO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	0.0	m³	nenhum	

Galeria de Fotos	
ATERRO E COMPACTAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO 	ATERRO E COMPACTAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO 

Fiscal


Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

 Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000047
	Dias Decorridos: 71	Data: 25/11/2022 (Sexta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 21	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CHUVA-CO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	0.0	m²	nenhum	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	0.0	m²	nenhum	
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
VIGAS BALDRAME, ALVENARIA 	

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000048
	Dias Decorridos: 74	Data: 28/11/2022 (Segunda-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 18	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	0.0	m²	nenhum	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	0.0	m²	nenhum	
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
CHAPISCO EXTERNO 	

Fiscal




Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000049
	Dias Decorridos: 75	Data: 29/11/2022 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 17	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	0.0		nenhum	
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
FABRICAÇÃO DE TESOURAS 	FABRICAÇÃO DE TESOURAS 

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

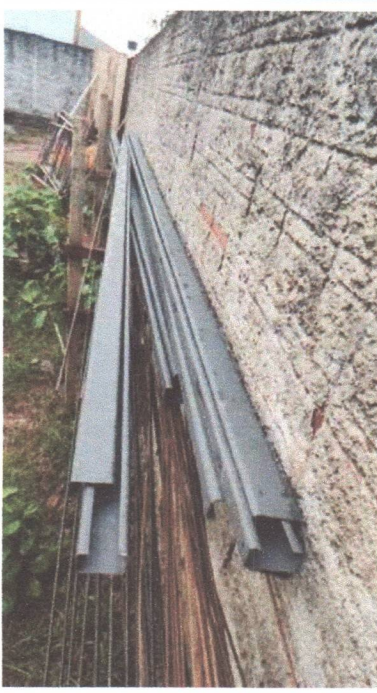
Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000050
	Dias Decorridos: 76	Data: 30/11/2022 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 16	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	


Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	0.0		nenhum	
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
FABRICAÇÃO DE TESOURAS 	FABRICAÇÃO DE TESOURAS 

Fiscal




 Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000051
	Dias Decorridos: 77	Data: 01/12/2022 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 15	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVEnte DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	0.0		nenhum	
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
INSTALAÇÃO DE TESOURAS AÇO 	INSTALAÇÃO DE TESOURAS AÇO 

Fiscal


Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 186170-RO

 Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000052
	Dias Decorridos: 78	Data: 02/12/2022 (Sexta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 14	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	0.0		nenhum	
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
INSTALAÇÃO DE TESOURAS AÇO 	

Fiscal


Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

 Responsável Técnico





Dias Contratuais: 92

RDO: 00000053

Dias Decorridos: 81

Data: 05/12/2022 (Segunda-Feira)

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Dias para Terminar: 11

Início: 16/09/2022

Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000

Termino Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos

CHAPISCO



CHAPISCO



Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000054
	Dias Decorridos: 82	Data: 06/12/2022 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 10	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	


Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
TELAHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO


TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO


Fiscal


Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

 Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000056
	Dias Decorridos: 84	Data: 08/12/2022 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 8	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° EM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	0.0		nenhum	
Observações	Sem sub-tarefa			
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
COBERTURA 	

Fiscal


 Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 185170-RO

 Responsável Técnico

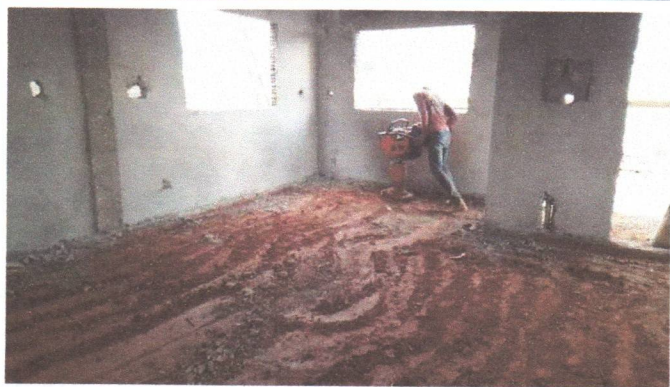


	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000057
	Dias Decorridos: 85	Data: 09/12/2022 (Sexta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 7	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
AT: 01 - MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO ME: 01 - VALA DE 0,50m DE PROFUNDIDADE. AF_05/2016	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 	COMPACTAÇÃO DE SOLO 

Fiscal


Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 185170-RO

 Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000058
	Dias Decorridos: 88	Data: 12/12/2022 (Segunda-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 4	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVEnte DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
REBOCO 	

Fiscal


Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

 Responsável Técnico





Dias Contratuais: 92

RDO: 00000063

Dias Decorridos: 89

Data: 13/12/2022 (Terça-Feira)

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Dias para Terminar: 3

Início: 16/09/2022

Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000

Termino Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra

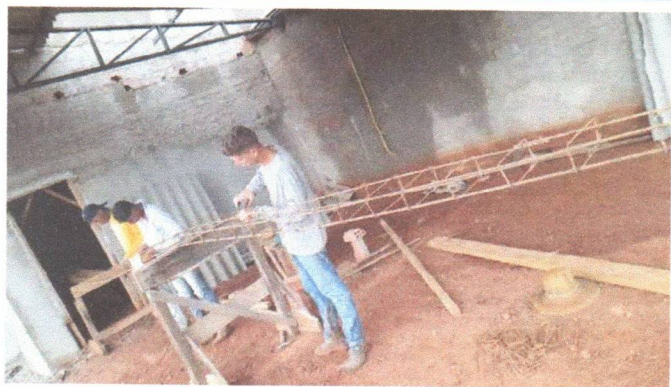
Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
VIA DE CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBOS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 5,00MM COM DIMENSÕES DE 26CMX14XCM EM CONCRETO 25MPA	0,0		nenhum	

Galeria de Fotos

FERRAGENS PARA MURO



Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000063
	Dias Decorridos: 90	Data: 14/12/2022 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 2	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
VIG. CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBOS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 5,00MM COM DIMENSÕES DE 26CMX14XCM EM CONCRETO 25MPA	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
ARMAÇÃO PARA MURO 	

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

 Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000061
	Dias Decorridos: 91	Data: 15/12/2022 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: 1	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
REBOCO 	

Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico





Dias Contratuais: 92

RDO: 00000062

Dias Decorridos: 92

Data: 16/12/2022 (Sexta-Feira)

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Dias para Terminar: 0

Início: 16/09/2022

Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000

Termino Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	0.0	m³	nenhum	

Galeria de Fotos

COMPACTAÇÃO DE SOLO



Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico

