



L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 14.372.416/0001-45

Ofício 001/2023

SOLICITAÇÃO DA QUATA MEDIÇÃO

CONTRATO N° 003/2022



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ALMOXARIFADO, GARAGEM E ADEQUAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE SITUA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECISRO, NOS MOLDES DO PROJETO ELABORADO PELA CAMARA MUNICIPAL.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS – RO CNPJ 01.640.319/0001-44, situada na Av. Afonso Pena, 3951, Cento de Alto Alegre dos Parecis RO, neste ato representado pelo seu presidente, VALMIRO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, portador do CPF.: 409.019.632-91.

A Empresa **L. P. M. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 14.372.416/0001-45. Vem através desta solicitar **A QUARTA MEDIÇÃO**. Conforme os anexos do diário de obra e relatório fotografico, do objeto citado acima.

Aguardando deferimento.

Nova Brasilândia D'Oeste/RO, 23 de janeiro de 2023.

José A.C. Eugênio

LPM PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA –
14.372.416/0001-45

Av. 13 de maio, 2297, Centro Nova Brasilândia D'Oeste - RO

(69) 3418-2655 – 99996-2306 – 98469-3317

E-mail: friagemarcondicionado@hotmail.com



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ALMOXARIFADO, GARAGEM E ADEQUAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE SITUA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARCISRO, NOS MOLDES DO PROJETO ELABORADO PELA CAMARA MUNICIPAL.

Planilha de Levantamento para Medição

Item	Descrição	Quant. Orcada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição
1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					23.855,25	R\$ 6.436,34	R\$ 6.436,34	R\$ 6.436,34	R\$ 1.515,41
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,0	3,0	100,0%	14.762,79	14.762,79	R\$ 4.920,93	R\$ 4.920,93	R\$ 4.920,93	R\$ 1.515,41
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	78,0	52,0	66,67%	6.061,64	9.092,46	R\$ 1.515,41	R\$ 1.515,41	R\$ 1.515,41	R\$ 1.515,41
2	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO, DEPÓSITO E GARAGEM					258.712,11	R\$ 49.108,69	R\$ 72.240,78	R\$ 41.240,22	R\$ 39.330,98
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					7.335,41	R\$ 7.335,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,0	6,0	100,0%	2.985,90	2.985,90	R\$ 2.985,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	1,0	1,0	100,0%	275,33	275,33	R\$ 275,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	6,0	6,0	100,0%	4.074,18	4.074,18	R\$ 4.074,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	COMPRESSADA INCHUSO PRATTI FIRAS DEMOLIÇÕES E RETRADAS					1.512,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,29	0,0	0,0%	0,00	849,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	18,52	0,0	0,0%	0,00	183,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	185,2	0,0	0,0%	0,00	679,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	INFRAESTRUTURA					35.371,34	R\$ 34.491,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 889,84
2.3.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	69,43	69,43	100,0%	3.922,10	3.922,10	R\$ 3.922,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,51
2.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	17,07	17,07	100,0%	1.615,16	1.615,16	R\$ 1.615,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	11,2	11,2	100,0%	425,04	425,04	R\$ 425,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	114,46	114,46	100,0%	3.016,02	3.016,02	R\$ 3.016,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	0,63	0,63	100,0%	15,93	15,93	R\$ 15,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	131,31	131,31	100,0%	3.156,69	3.156,69	R\$ 3.156,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.7	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X14X24 CM	28,17	28,17	100,0%	2.725,44	2.725,44	R\$ 2.725,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	133,11	133,11	100,0%	2.881,83	2.881,83	R\$ 2.881,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	161,47	161,47	100,0%	2.966,20	2.966,20	R\$ 2.966,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	48,29	48,29	100,0%	3.528,06	3.528,06	R\$ 3.528,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	5,87	5,87	100,0%	4.058,34	4.058,34	R\$ 4.058,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	5,87	5,87	100,0%	1.869,77	1.869,77	R\$ 1.869,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	105,14	105,14	100,0%	5.190,76	5.190,76	R\$ 5.190,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4	SUPERESTRUTURA					54.511,30	R\$ 0,00	R\$ 49.886,79	R\$ 3.974,13	R\$ 650,36
2.4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO ITI 17 ANDAR AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	220,86	220,86	100,0%	5.819,66	5.819,66	R\$ 5.819,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO ITI 17 ANDAR AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	8,37	8,37	100,0%	211,67	211,67	R\$ 211,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO ITI 17 ANDAR AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	189,09	189,09	100,0%	4.536,26	4.536,26	R\$ 4.536,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO ITI 17 ANDAR AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	284,85	284,85	100,0%	6.135,66	6.135,66	R\$ 6.135,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO ITI 17 ANDAR AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	45,27	45,27	100,0%	823,46	823,46	R\$ 823,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 ITI 17 ANDAR. AF_08/2020	104,08	104,08	100,0%	15.112,41	15.112,41	R\$ 15.112,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 ITI 17 ANDAR. AF_08/2020	68,22	68,22	100,0%	8.891,11	8.891,11	R\$ 8.891,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	5,92	5,92	100,0%	1.689,21	1.689,21	R\$ 1.689,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.9	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	5,92	5,92	100,0%	90,81	90,81	R\$ 90,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	9,2	9,2	100,0%	6.360,59	6.360,59	R\$ 6.360,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	9,2	9,2	100,0%	2.930,47	2.930,47	R\$ 2.930,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.12	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	8,4	8,4	100,0%	741,30	741,30	R\$ 741,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.13	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	8,4	8,4	100,0%	722,98	722,98	R\$ 722,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.14	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5,6	5,6	100,0%	445,70	445,70	R\$ 445,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5	PARADES E PAINÉIS					40.905,64	R\$ 7.291,78	R\$ 20.989,60	R\$ 8.229,75	R\$ 4.394,50
2.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X8X24CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PARADES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	65,95	65,95	100,0%	10.224,88	10.224,88	R\$ 10.224,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X8X24CM (ESPESURA 14CM) DE PARADES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	117,42	117,42	100,0%	14.823,10	14.823,10	R\$ 14.823,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	445,19	445,19	100,0%	3.562,67	3.562,67	R\$ 3.562,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



2.5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAIAS AF_06/2014	445,19	445,19	100,0%	12.284,98	12.284,98				285,88	158,51
										R\$ 7.870,48	R\$ 4.394,50
2.6	PISO E PAVIMENTAÇÃO				29.413,52		R\$ 0,00	R\$ 1.364,39	R\$ 0,00	R\$ 11.407,02	
2.6.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	25,56	25,56	100,0%	2.728,78	2.728,78				38,78%	12,78
								R\$ 1.364,39		R\$ 1.364,39	50,00%
2.6.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	77,55	0,0	0,0%	0,00	13.988,46					
2.6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO AF_07/2016	50,23	50,23	100,0%	7.433,53	7.433,53				50,23	
										R\$ 7.433,53	100,00%
2.6.4	RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	50,23	0,0	0,0%	0,00	2.653,65					
2.6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO AF_07/2016	1,6	1,6	100,0%	1.674,83	1.674,83				1,6	
										R\$ 1.674,83	100,00%
2.6.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X24 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	6,28	6,28	100,0%	934,27	934,27				6,28	
	COM PREPARO EM REFINAÇÃO									R\$ 934,27	100,00%
2.7	FORRO E COBERTURA				54.595,92		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.216,34	R\$ 11.187,76	
2.7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC. FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	127,78	0,0	0,0%	0,00	14.138,85				53,51%	20,48%
2.7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO ICAMFINTO AF_12/2015	3,0	3,0	100,0%	4.974,21	4.974,21				3,0	
										R\$ 4.974,21	100,00%
2.7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	50,23	50,23	100,0%	3.633,13	3.633,13				50,23	
										R\$ 3.633,13	100,00%
2.7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMFINTO AF_07/2016	2,0	2,0	100,0%	2.712,12	2.712,12				2,0	
										R\$ 2.712,12	100,00%
2.7.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMFINTO AF_07/2016	4,0	4,0	100,0%	7.376,40	7.376,40				4,0	
										R\$ 7.376,40	100,00%
2.7.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	78,36	78,0	99,54%	1.499,16	1.506,07				78,0	
										R\$ 1.499,16	99,54%
2.7.7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMFINTO. AF_07/2016	127,78	127,0	99,39%	7.500,62	7.546,88				127,0	
										R\$ 7.500,62	99,39%
2.7.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	36,48	36,48	100,0%	2.621,08	2.621,08					
										36,48	
2.7.9	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	74,06	74,06	100,0%	4.900,55	4.900,55				R\$ 2.621,08	100,00%
										74,06	
2.7.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	20,1	20,1	100,0%	1.787,49	1.787,49				R\$ 4.900,55	100,00%
										17,1	
2.7.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	45,17	45,17	100,0%	2.910,75	2.910,75				R\$ 1.520,70	52,20%
										45,17	
2.7.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	11,0	11,0	100,0%	424,82	424,82					
	ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014									11,0	
2.7.13	TE. PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	1,0	1,0	100,0%	63,77	63,77				R\$ 424,82	100,00%
										1,0	
2.8	PINTURA E ACABAMENTO				19.009,12		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.801,50	
2.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	445,19	445,19	100,0%	1.197,56	1.197,56				56,82%	445,19
										R\$ 1.197,56	100,00%
2.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	445,19	0,0	0,0%	0,00	7.959,99					
2.8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS EXTERNAS COM E SEM PRESENÇA DE VÃOS	305,87	305,87	100,0%	7.628,39	7.628,39				305,87	
										R\$ 7.628,39	100,00%
2.8.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PVA (MASSA CORRIDA) EM PAREDES	139,32	139,32	100,0%	1.975,55	1.975,55				139,32	
	INTERNAS COM F SEM PRESENÇA DE VÃOS									R\$ 1.975,55	100,00%
2.8.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	11,86	0,0	0,0%	0,00	247,63					
2.9	ESQUADRIAS				5.359,72		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PUNTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,0	0,0	0,0%	0,00	2.111,62					
2.9.2	Janelas de Vidro Temperado, DE CORRER, fornecimento e instalação	4,0	0,0	0,0%	0,00	1.754,68					
2.9.3	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1.00x2.10m	1,0	0,0	0,0%	0,00	1.463,42					
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				9.161,95		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.10.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,11	0,0	0,0%	0,00	63,49					
2.10.2	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1")	171,79	0,0	0,0%	0,00	1.984,48					
2.10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	107,19	0,0	0,0%	0,00	385,88					
2.10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	233,0	0,0	0,0%	0,00	1.220,92					
2.10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	141,14	0,0	0,0%	0,00	2.046,53					
2.10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,0	0,0	0,0%	0,00	59,40					
2.10.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00	80,85					
2.10.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,0	0,0	0,0%	0,00	338,00					
2.10.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,0	0,0	0,0%	0,00	75,47					
2.10.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,0	0,0	0,0%	0,00	113,50					
2.10.11	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	14,0	0,0	0,0%	0,00	1.294,30					
2.10.12	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	75,72					
2.10.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00	625,16					
2.10.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDADE (30mA) BIPOLAR 63A	1,0	0,0	0,0%	0,00	344,75					
2.10.15	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	443,50					
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1.535,75		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.11.1	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	100,98					
2.11.2	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,0	0,0	0,0%	0,00	44,98					
2.11.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,0	0,0	0,0%	0,00	14,64					



Joel Taveres dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RJ 185170-RJ

Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000063
	Dias Decorridos: 95	Data: 19/12/2022 (Segunda-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -3	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
VIGA CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 5,00MM COM DIMENSÕES DE 26CMX14XCM EM CONCRETO FCK DE 20MPA	0.0		nenhum	
PILAR EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCK DE 20MPA	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
ARMAÇÃO PILARES E VIGAS BALDRAME 	

Fiscal


 Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

 Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000064
	Dias Decorridos: 96	Data: 20/12/2022 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -4	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
VIGA CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 5,00MM COM DIMENSÕES DE 26CMX14XCM EM CONCRETO MPA	0.0		nenhum	
PILAR EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCK DE 20MPA	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
ARMAÇÃO PILARES E VIGAS BALDRAME 	

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

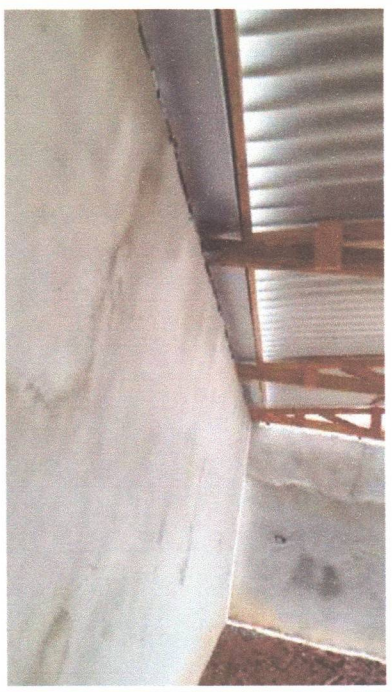
Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000065
	Dias Decorridos: 97	Data: 21/12/2022 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -5	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	


Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0.0		nenhum	
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
ELETRODUTOS 	ELETRODUTOS 

Fiscal




 Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 185170-RO

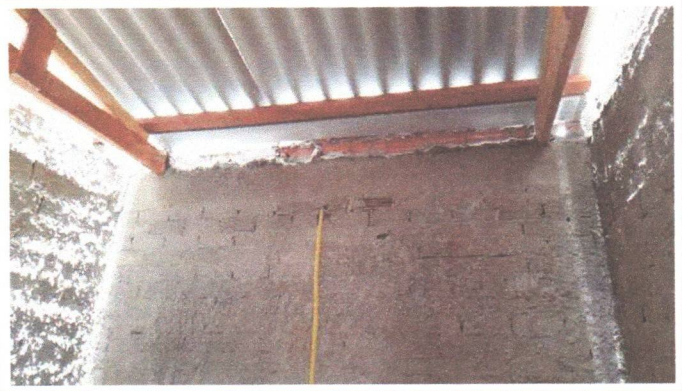
 Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000066
	Dias Decorridos: 98	Data: 22/12/2022 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -6	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	


Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	0.0		nenhum	
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
ELETRODUTOS 	ELETRODUTOS 

Fiscal




 Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

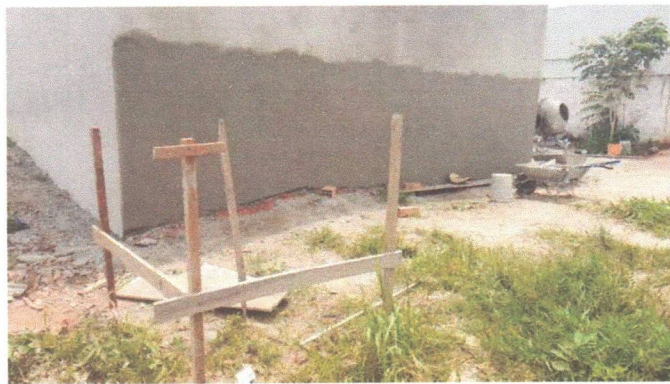
 Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000067
	Dias Decorridos: 99	Data: 23/12/2022 (Sexta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -7	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
REBOCO 	REBOCO 


Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 185170-RO

Fiscal

Responsável Técnico

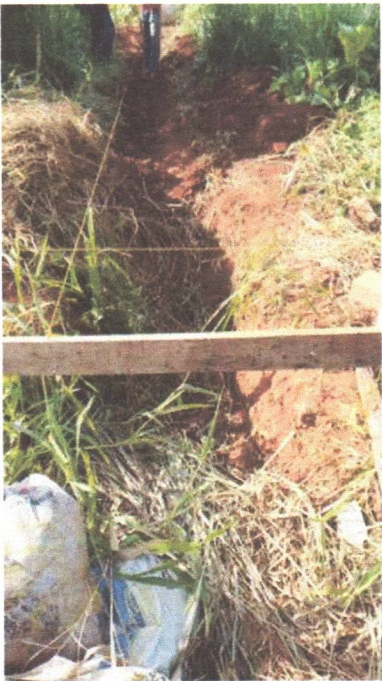


	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000068
	Dias Decorridos: 103	Data: 27/12/2022 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -11	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
MURO 	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000069
	Dias Decorridos: 104	Data: 28/12/2022 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -12	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000070
	Dias Decorridos: 105	Data: 29/12/2022 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -13	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
CAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
ALVENARIA 	

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico



Dias Contratuais: 92

RDO: 00000071

Dias Decorridos: 106

Data: 30/12/2022 (Sexta-Feira)

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Dias para Terminar: -14

Início: 16/09/2022

Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000

Termino Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
PEDREIRO (HORISTA)	2	
SERVENTE DE OBRAS	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

ALVENARIA



ALVENARIA



Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro CMI
CREA-RO 185170-RO

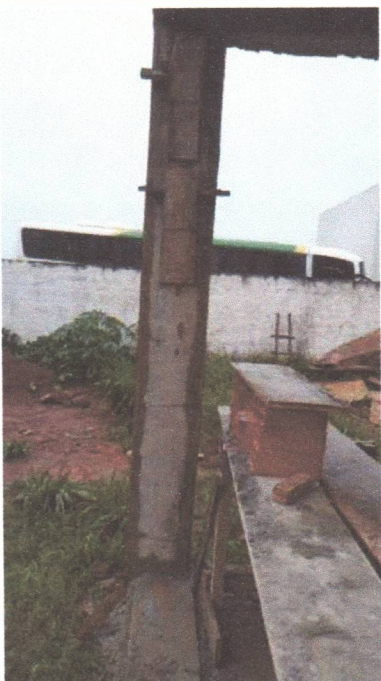
Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000074
	Dias Decorridos: 110	Data: 03/01/2023 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -18	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO (HORISTA)	2	


Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
MURO 	MURO 

Fiscal




Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

 Responsável Técnico

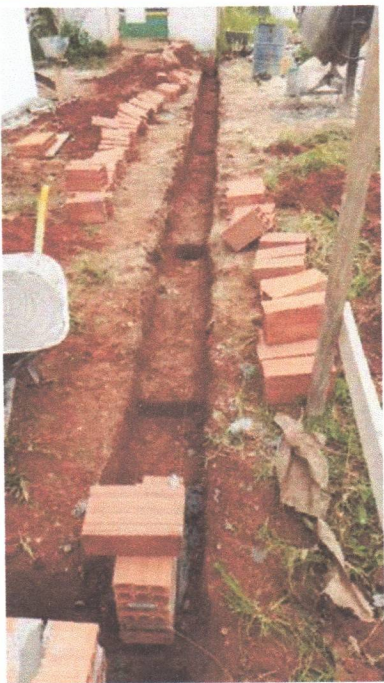
	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000074
	Dias Decorridos: 111	Data: 04/01/2023 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -19	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Clima	Praticável		
claro	sim	08:00	

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM BETONEIRA.	0.0	m²	nenhum	

Galeria de Fotos	
MURO 	MURO 

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

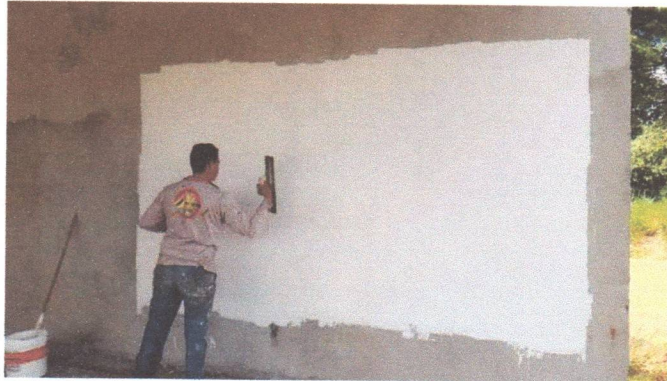
Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000072
	Dias Decorridos: 112	Data: 05/01/2023 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -20	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PINTURA GERAL 	PINTURA GERAL 

Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000073
	Dias Decorridos: 113	Data: 06/01/2023 (Sexta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -21	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PINTURA GERAL 	

Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico

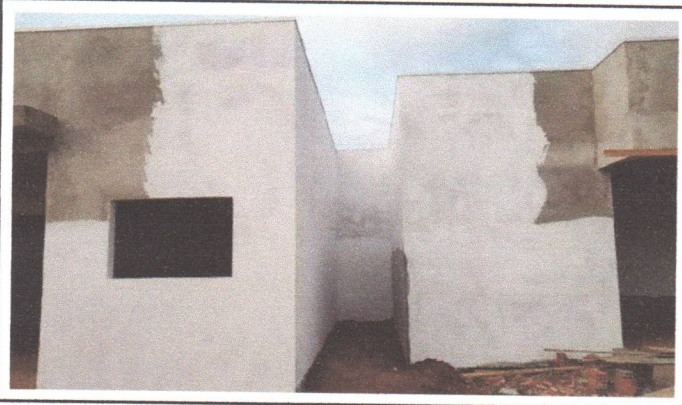


	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000074
	Dias Decorridos: 116	Data: 09/01/2023 (Segunda-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -24	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PINTURA GERAL 	PINTURA GERAL 

Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000075
	Dias Decorridos: 117	Data: 10/01/2023 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -25	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

PINTURA GERAL



PINTURA GERAL



Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000076
	Dias Decorridos: 118	Data: 11/01/2023 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -26	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	


Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

CALÇADA 	CALÇADA 
---	--

Fiscal




Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

 Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000077
	Dias Decorridos: 119	Data: 12/01/2023 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -27	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

CALÇADA



CALÇADA



Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000078
	Dias Decorridos: 123	Data: 16/01/2023 (Segunda-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -31	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

CALÇADA



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Fiscal

Responsável Técnico

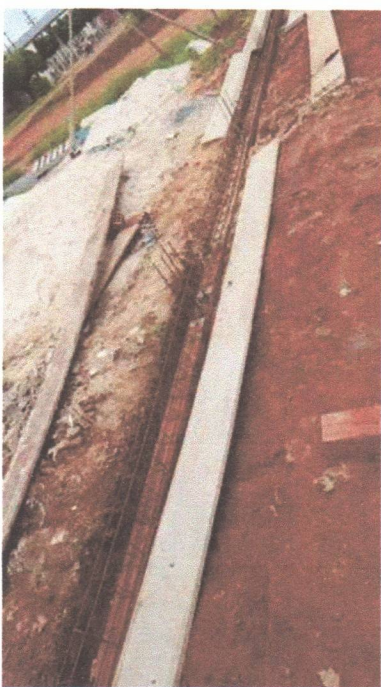


	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000079
	Dias Decorridos: 124	Data: 17/01/2023 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -32	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
LAJE DE CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBOS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 5,00MM COM DIMENSÕES DE 26CMX14XCM EM CONCRETO 25MPA	0.0		nenhum	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	0.0		nenhum	
PILAR EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBOS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCK DE 20MPA	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
MURO 	

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000080
	Dias Decorridos: 125	Data: 18/01/2023 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -33	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
VIGA CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 5,00MM COM DIMENSÕES DE 26CMX14XCM EM CONCRETO 20MPA	0.0		nenhum	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	0.0		nenhum	
PILAR EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCK DE 20MPA	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
CONSTRUÇÃO DO MURO 	

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000081
	Dias Decorridos: 126	Data: 19/01/2023 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -34	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCK DE 20MPA	0.0	M	nenhum	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	0.0		nenhum	
PILAR EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCK DE 20MPA	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
CONSTRUÇÃO DO MURO 	

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000082
	Dias Decorridos: 127	Data: 20/01/2023 (Sexta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -35	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
1.000 M³ EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCK DE 20MPA	0.0	M	nenhum	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	0.0		nenhum	
PILAR EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCK DE 20MPA	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
CONSTRUÇÃO DO MURO 	

Fiscal




Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 185170-RO

 Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000083
	Dias Decorridos: 130	Data: 23/01/2023 (Segunda-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Término: -38	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Término Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	1	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCK DE 20MPA	0.0	M	nenhum	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	0.0		nenhum	
PILAR EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCK DE 20MPA	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
CONSTRUÇÃO DO MURO 	CONSTRUÇÃO DO MURO 

Fiscal


Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

 Responsável Técnico

