



L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 14.372.416/0001-45

Ofício 001/2023

SOLICITAÇÃO DA QUINTA MEDIÇÃO

CONTRATO N° 003/2022



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ALMOXARIFADO, GARAGEM E ADEQUAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE SITUA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, NOS MOLDES DO PROJETO ELABORADO PELA CAMARA MUNICIPAL.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS – RO CNPJ 01.640.319/0001-44, situada na Av. Afonso Pena, 3951, Cento de Alto Alegre dos Parecis RO, neste ato representado pelo seu presidente, VALMIRO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, portador do CPF.: 409.019.632-91.

A Empresa **L. P. M. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 14.372.416/0001-45. Vem através desta solicitar **A QUINTA MEDIÇÃO**. Conforme os anexos do diário de obra e relatório fotografico, do objeto citado acima.

Aguardando deferimento.

Nova Brasilândia D'Oeste/RO, 05 de março de 2023.

José A.C. Eugênio

**LPM PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA –
14.372.416/0001-45**

Av. 13 de maio, 2297, Centro Nova Brasilândia D'Oeste - RO

(69) 3418-2655 – 99996-2306 – 98469-3317
E-mail: friagemarcondicionado@hotmail.com



Obra

1% - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ALMOXARIFADO, GARAGEM E ADEQUAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE SITUA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARACÍS, NOS MOLDES DO PROJETO ELABORADO PELA CAMARA MUNICIPAL.

L. P. M. ENGENHARIA
CNPJ: 14.372.416/0001-45

QUINTA MEDIÇÃO

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 19/10/2022	2ª Medição 18/11/2022	3ª Medição 21/12/2022	4ª Medição 23/01/2023	5ª Medição
1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					23.855,25	R\$ 6.436,34	R\$ 6.436,34	R\$ 6.436,34	R\$ 932,56	R\$ 2.098,26
1.1	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,0	3,0	100,0%	14.762,79	14.762,79	R\$ 4.920,93	R\$ 4.920,93	R\$ 4.920,93	R\$ 932,56	R\$ 2.098,26
							26,98%	26,98%	26,98%	3,90%	8,79%
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	78,0	65,0	83,33%	7.577,05	9.092,46	R\$ 1.515,41	R\$ 1.515,41	R\$ 1.515,41	R\$ 932,56	R\$ 2.098,26
							16,67%	16,67%	16,67%	10,26%	23,08%
2	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO, DEPÓSITO E GARAGEM					258.712,11	R\$ 49.108,69	R\$ 72.240,78	R\$ 41.420,22	R\$ 33.900,41	R\$ 28.140,65
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					7.335,41	R\$ 7.335,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,0	6,0	100,0%	2.985,90	2.985,90	R\$ 2.985,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	1,0	1,0	100,0%	275,33	275,33	R\$ 275,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	6,0	6,0	100,0%	4.074,18	4.074,18	R\$ 4.074,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.512,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.512,44
2.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,29	10,29	100,0%	649,60	649,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.512,44
2.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	18,52	18,52	100,0%	183,16	183,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.512,44
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	185,2	185,2	100,0%	679,68	679,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.512,44
2.3	INFRAESTRUTURA					35.371,34	R\$ 34.481,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 889,84	R\$ 0,00
2.3.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	69,43	69,43	100,0%	3.922,10	3.922,10	R\$ 3.922,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	17,07	17,07	100,0%	1.615,16	1.615,16	R\$ 1.615,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	11,2	11,2	100,0%	425,04	425,04	R\$ 425,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



AV. Treze de Maio - CENTRO - Nova Brasilândia DOeste / RO
/edsonmenez@hotmail.com



2.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	114,46	114,46	100,0%	3.016,02	3.016,02	114,46	R\$ 3.016,02	100,00%
2.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0,63	0,63	100,0%	15,93	15,93	0,63	R\$ 15,93	100,00%
2.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	131,31	131,31	100,0%	3.156,69	3.156,69	131,31	R\$ 3.156,69	100,00%
2.3.7	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO CERÂMICO FURADO 9X14X24 CM	28,17	28,17	100,0%	2.725,44	2.725,44	28,17	R\$ 2.725,44	100,00%
2.3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	133,11	133,11	100,0%	2.881,83	2.881,83	133,11	R\$ 2.881,83	100,00%
2.3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	161,47	161,47	100,0%	2.966,20	2.966,20	113,03	R\$ 2.076,36	48,44 R\$ 889,84 30,00%
2.3.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	48,29	48,29	100,0%	3.528,06	3.528,06	48,29	R\$ 3.528,06	70,00%
2.3.11	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	5,87	5,87	100,0%	4.058,34	4.058,34	5,87	R\$ 4.058,34	100,00%
2.3.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	5,87	5,87	100,0%	1.869,77	1.869,77	5,87	R\$ 1.869,77	100,00%
2.3.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	105,14	105,14	100,0%	5.190,76	5.190,76	105,14	R\$ 5.190,76	100,00%
2.4	SUPERESTRUTURA				54.511,30	54.511,30	R\$ 0,00	R\$ 49.886,79	R\$ 3.974,13
2.4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	220,86	220,86	100,0%	5.819,66	5.819,66	220,86	R\$ 5.819,66	91,51% 220,86 100,00%
2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	8,37	8,37	100,0%	211,67	211,67	8,37	R\$ 211,67	100,00%
2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	189,09	189,09	100,0%	4.536,26	4.536,26	189,09	R\$ 4.536,26	100,00%
2.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	284,85	284,85	100,0%	6.135,66	6.135,66	284,85	R\$ 5.535,78	27,85 R\$ 599,88 9,78%
2.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	45,27	45,27	100,0%	823,46	823,46	45,27	R\$ 823,46	100,00%
2.4.6	PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	104,08	104,08	100,0%	15.112,41	15.112,41	90,0	R\$ 13.068,00	14,08 R\$ 2.044,41 13,53%

2.4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	68,22	100,0%	8.891,11	8.891,11	60,0	8,22	R\$ 7.819,80	R\$ 1.071,31	87,95%	12,05%	
2.4.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	5,92	100,0%	1.689,21	1.689,21	5,92		R\$ 1.689,21		100,00%		
2.4.9	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	5,92	100,0%	90,81	90,81	5,92		R\$ 90,81		100,00%		
2.4.10	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	9,2	100,0%	6.360,59	6.360,60	8,3	0,85	R\$ 5.738,37	R\$ 587,66	90,22%	9,24%	0,05
2.4.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	9,2	100,0%	2.930,46	2.930,47	8,3	0,85	R\$ 2.643,79	R\$ 270,75	90,22%	9,24%	0,05
2.4.12	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	8,4	100,0%	741,30	741,30	8,4		R\$ 741,30		100,00%		
2.4.13	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	8,4	100,0%	722,98	722,98	8,4		R\$ 722,98		100,00%		
2.4.14	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	5,6	100,0%	445,70	445,70	5,6		R\$ 445,70		100,00%		
2.5	PAREDES E PAINÉIS			40.905,64	40.905,64	R\$ 7.291,78	R\$ 20.989,60	R\$ 8.229,75	R\$ 4.394,50	20,11%	10,74%	R\$ 0,00
2.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR	65,95	100,0%	10.224,88	10.224,88	17,82%	51,31%	24,64	41,31			
2.5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	117,42	100,0%	14.823,10	14.823,10	27,5	89,92	R\$ 3.471,60	R\$ 11.351,50	23,42%	76,58%	
2.5.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE	445,19	100,0%	3.592,67	3.592,68	400,67	44,52	R\$ 3.233,40	R\$ 359,27	90,00%	10,00%	
2.5.4	PISO E PAVIMENTAÇÃO	445,19	100,0%	12.264,98	12.264,98	285,68	159,51	R\$ 7.870,48	R\$ 4.394,50	64,17%	35,83%	
2.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	25,56	100,0%	2.728,78	2.728,78	R\$ 0,00	R\$ 1.364,39	R\$ 0,00	R\$ 8.797,92	R\$ 2.609,10	0,00%	8,87%
2.6.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	77,55	100,0%	13.988,46	13.988,46	4,63%	12,78	R\$ 1.364,39		50,00%		
2.6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	50,23	100,0%	7.433,53	7.433,53							
2.6.3												



	RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	50,23	50,23	100,0%	2.653,65	2.653,65		R\$ 1.674,83 100,00%
2.6.4								
2.6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1,6	1,6	100,0%	1.674,83	1.674,83		1,6 R\$ 1.674,83 100,00%
2.6.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	6,28	6,28	100,0%	934,27	934,27		6,28 R\$ 934,27 100,00%
2.7	FORRO E COBERTURA							R\$ 14.138,85 127,78 R\$ 14.138,85
2.7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	127,78	127,78	100,0%	14.138,85	14.138,85	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00% R\$ 25.216,34 R\$ 10.286,56 18,84%
2.7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	3,0	3,0	100,0%	4.974,21	4.974,21		3,0 R\$ 4.974,21 100,00%
2.7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	50,23	50,23	100,0%	3.633,13	3.633,13		50,23 R\$ 3.633,13 100,00%
2.7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO FIBROCIMENTO.	2,0	2,0	100,0%	2.712,12	2.712,12		2,0 R\$ 2.712,12 100,00%
2.7.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	4,0	4,0	100,0%	7.376,40	7.376,40		4,0 R\$ 7.376,40 100,00%
2.7.6	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	78,36	78,36	100,0%	1.506,07	1.506,07		78,0 R\$ 1.499,16 99,54%
2.7.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	127,78	127,78	100,0%	7.546,68	7.546,68		127,0 R\$ 7.500,62 99,39%
2.7.8	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	36,48	30,0	82,24%	2.155,50	2.621,08		30,0 R\$ 2.155,50 82,24%
2.7.9	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, ENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	74,06	74,06	100,0%	4.900,55	4.900,55		74,06 R\$ 4.900,55 100,00%
2.7.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS).	20,1	20,1	100,0%	1.787,49	1.787,49		17,1 R\$ 1.520,70 85,07%
2.7.11	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	45,17	45,17	100,0%	2.910,75	2.910,75		45,17 R\$ 2.910,75 100,00%
2.7.12	TÊ. PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	11,0	0,0	0,0%	0,00	424,82		
2.7.13		1,0	0,0	0,0%	0,00	63,77		



Camara Municipal de Alto Alegre dos Parecis

Proc. nº _____

fls. nº _____

CPL

2.10.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,0	8,0	80,0%	270,40	338,00
2.10.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,0	1,0	100,0%	75,47	75,47
2.10.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,0	2,0	100,0%	113,50	113,50
2.10.11	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	14,0	14,0	100,0%	1.294,30	1.294,30
2.10.12	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	75,72
2.10.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,0	1,0	100,0%	625,16	625,16
2.10.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) BIPOLAR 63A	1,0	0,0	0,0%	0,00	344,75
2.10.15	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	443,50
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					1.535,75
2.11.1	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,0	1,0	50,0%	50,48	100,96
2.11.2	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,0	1,0	50,0%	22,49	44,98
2.11.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,0	1,0	50,0%	7,32	14,64
2.11.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	51,64	0,0	0,0%	0,00	1.375,17
3	CONSTRUÇÃO DO MURO					27.000,62
3.1	VIGA CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A	40,53	40,53	100,0%	4.586,37	4.586,37
3.2	CADA 15 CM COM BARRAS DE 5,00MM COM DIMENSÕES DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM BARRAS LONGITUDINAIS DE 8,00MM E ESTRIBUS A CADA 15 CM COM BARRAS DE 4,20MM COM DIMENSÕES DE 20CMX14CM FCK DE 20MPA	52,5	52,5	100,0%	3.637,20	3.637,20
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR	105,0	105,0	100,0%	13.255,20	13.255,20
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.727,58
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 95,28%
						R\$ 40,53
						R\$ 4.586,37
						100,00%
						52,5
						R\$ 3.637,20
						100,00%
						105,0
						R\$ 13.255,20
						100,00%



3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	21,0	21,0	100,0%	1.895,88	1.895,88				21,0	R\$ 1.895,88 100,00%
3.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	225,65	225,65	100,0%	1.820,99	1.820,99				67,9	R\$ 547,95 30,09%
3.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	10,53	10,53	100,0%	1.566,54	1.566,54				10,53	R\$ 1.566,54 100,00%
3.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	2,52	2,52	100,0%	238,44	238,44				2,52	R\$ 238,44 100,00%
4	ACESSIBILIDADE				23.083,34	23.083,34					R\$ 0,00 0,00%
4.1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	43,2	0,0	0,0%	0,00	8.531,13					R\$ 0,00 0,00%
4.2	PISO TATIL ALERTA EM INOX PARAFUSADO COM RANHURAS (BOLINHA)	18,6	0,0	0,0%	0,00	5.649,93					
4.3	PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO (COM RANHURAS)	28,4	0,0	0,0%	0,00	7.244,84					
4.4	DEMOLICAO CONCRETO SIMPLES ATE 0,5M3	8,64	0,0	0,0%	0,00	610,67					
4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1,0	0,0	0,0%	0,00	1.046,77					
5	ADEQUAÇÃO COZINHA										
5.1	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,86	0,86	100,0%	53,26	53,26					R\$ 437,18 7,42%
5.2	DEMOLICÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,36	0,0	0,0%	0,00	255,47					R\$ 53,26 0,86 100,00%
5.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,68	1,68	100,0%	16,59	16,59					R\$ 16,59 100,00%
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	10,36	0,0	0,0%	0,00	2.069,92					
5.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	0,8	0,0	0,0%	0,00	115,27					
5.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM)	1,69	1,69	100,0%	247,66	247,66					R\$ 1,69 0,00%



5.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	3,36	3,36	100,0%	27,11	27,11	3,36	3,36	100,00%	R\$ 27,11	3,36	9,31%
5.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE PINTURA EPOXY 2 DEMAOS COM MASSA	3,36	3,36	100,0%	92,56	92,56	3,36	3,36	100,00%	R\$ 92,56	3,36	3,36%
5.9		38,92	0,0	0,0%	0,00	3,009,68						
Porcentagem Executada		16,41%	23,37%	14,14%	17,89%	9,31%						
Valor Executado		R\$ 55.545,03	R\$ 79.114,30	R\$ 47.856,56	R\$ 60.560,55	R\$						
Porcentagem Acumulada		16,41%	39,78%	53,91%	71,80%	81,11%						
Valor Executado Acumulado		R\$ 55.545,03	R\$ 134.659,33	R\$ 182.515,89	R\$ 243.076,44	R\$ 274.588,39						
Saldo Total												

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Setor de Engenharia



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000106
	Dias Decorridos: 161	Data: 23/02/2023 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -69	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PINTURA EPOXY 2 DEMAOS COM MASSA	0,0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PINTURA GERAL 	

Fiscal


 Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

 Responsável Técnico





Dias Contratuais: 92

RDO: 00000108

Dias Decorridos: 172

Data: 06/03/2023 (Segunda-Feira)

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Dias para Terminar: -80

Início: 16/09/2022

Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000

Termino Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

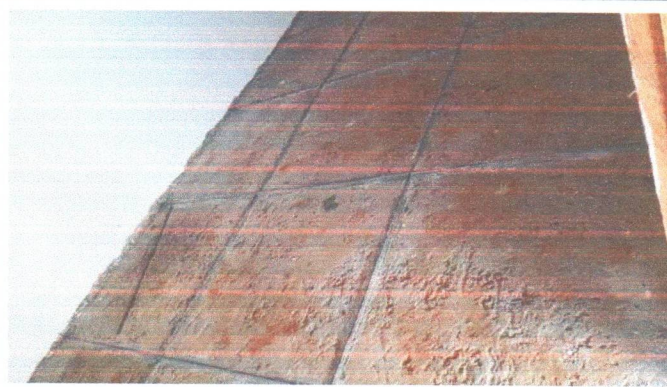
Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0.0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

PISO, RODAPE GRANILITE,

PISO, RODAPE GRANILITE,



Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000109
	Dias Decorridos: 173	Data: 07/03/2023 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -81	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0.0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PISO, RODAPE GRANILITE, 	PISO, RODAPE GRANILITE, 

Fiscal


 Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 18517D-RO

 Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000110
	Dias Decorridos: 174	Data: 08/03/2023 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -82	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0.0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PISO, RODAPE GRANILITE, 	PISO, RODAPE GRANILITE, 

Fiscal


Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 186170-RO

Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000111
	Dias Decorridos: 175	Data: 09/03/2023 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -83	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

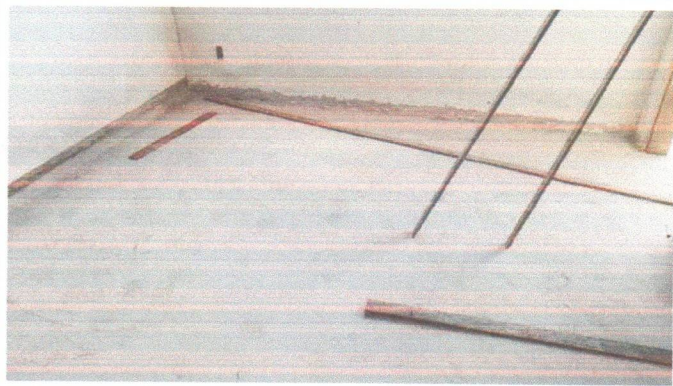
Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

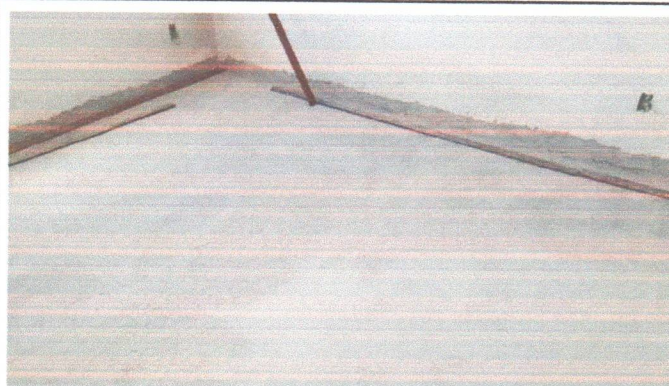
Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0.0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

PISO, RODAPE GRANILITE,



PISO, RODAPE GRANILITE,



Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico

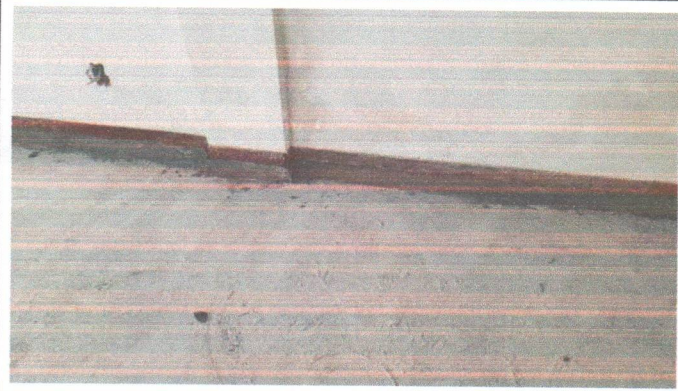
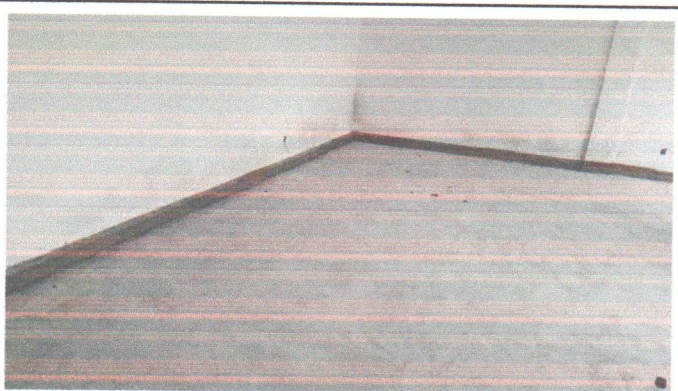


	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000112
	Dias Decorridos: 176	Data: 10/03/2023 (Sexta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -84	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0.0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PISO, RODAPE GRANILITE, 	PISO, RODAPE GRANILITE, 

Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico

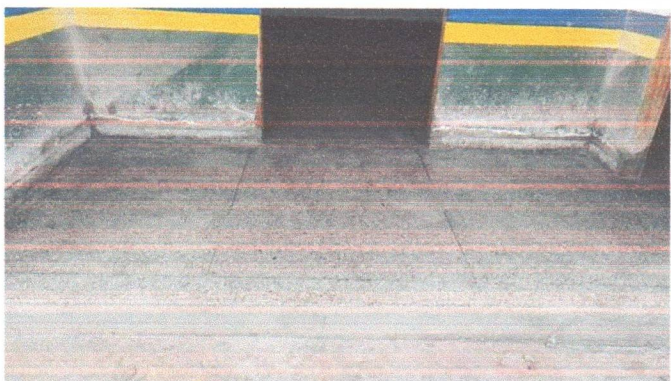


	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000113
	Dias Decorridos: 179	Data: 13/03/2023 (Segunda-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -87	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0,0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0,0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PISO, RODAPE GRANILITE, 	PISO, RODAPE GRANILITE, 

Fiscal


 Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 185170-RO

 Responsável Técnico





Dias Contratuais: 92

RDO: 00000114

Dias Decorridos: 180

Data: 14/03/2023 (Terça-Feira)

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Dias para Término: -88

Início: 16/09/2022

Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000

Término Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0.0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos


PISO, RODAPE GRANILITE,



PISO, RODAPE GRANILITE,



Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

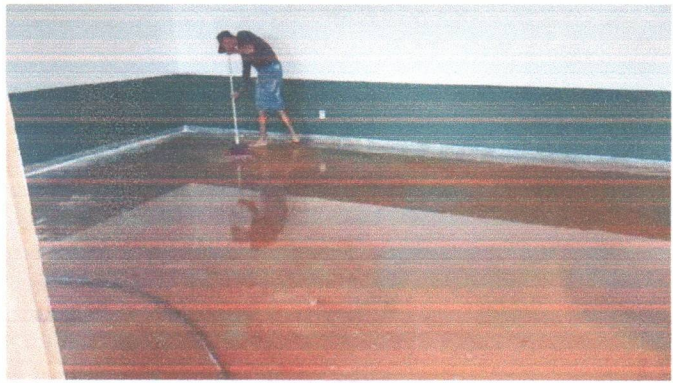
Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000115
	Dias Decorridos: 181	Data: 15/03/2023 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -89	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		


Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	


Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0.0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PISO, RODAPE GRANILITE, 	PISO, RODAPE GRANILITE, 

Fiscal




Joel Tavares dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-RO 185170-RO

 Responsável Técnico
