



L. P. M. PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 14.372.416/0001-45

Ofício 001/2023

SOLICITAÇÃO DA SEXTA MEDIÇÃO


CONTRATO N° 003/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ALMOXARIFADO, GARAGEM E ADEQUAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE SITUA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, NOS MOLDES DO PROJETO ELABORADO PELA CAMARA MUNICIPAL.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS – RO CNPJ 01.640.319/0001-44, situada na Av. Afonso Pena, 3951, Cento de Alto Alegre dos Parecis RO, neste ato representado pelo seu presidente, VALMIRO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, portador do CPF.: 409.019.632-91.

A Empresa **L. P. M. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 14.372.416/0001-45. Vem através desta solicitar **A SEXTA MEDIÇÃO**. Conforme os anexos do plano de obra e relatório fotográfico, do objeto citado acima.

Aguardando deferimento.



Nova Brasilândia D'Oeste/RO, 05 de março de 2023.

José A.C. Eugênio

**LPM PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA –
14.372.416/0001-45**

Av. 13 de maio, 2297, Centro Nova Brasilândia D'Oeste - RO

(69) 3418-2655 – 99996-2306 – 98469-3317

E-mail: friagemarcondicionado@hotmail.com



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ALMOXARIFADO, GARAGEM E ADEQUAÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO ONDE SITUA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECISRO,

Planilha de Levantamento para Medição

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 19/10/2022	2ª Medição 18/11/2022	3ª Medição 21/12/2022	4ª Medição 23/01/2023	5ª Medição 23/02/2023	6ª Medição 05/04/2023
1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					23.855,25	R\$ 6.436,34 26,98%	R\$ 6.436,34 26,98%	R\$ 6.436,34 26,98%	R\$ 1.515,41 6,35%	R\$ 1.515,41 6,35%	R\$ 1.165,70 4,88%
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,0	3,0	100,0%	14.762,79	14.762,79	R\$ 4.920,93 33,33%	R\$ 4.920,93 33,33%	R\$ 4.920,93 33,33%			
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	78,0	75,0	96,15%	8.742,75	9.092,46	R\$ 1.515,41 16,67%	R\$ 1.515,41 16,67%	R\$ 1.515,41 16,67%	R\$ 1.515,41 16,67%	R\$ 1.515,41 16,67%	R\$ 1.165,70 12,82%
2	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO, DEPÓSITO E GARAGEM					258.712,11	R\$ 49.108,69 18,98%	R\$ 72.240,78 27,92%	R\$ 41.420,22 16,01%	R\$ 39.330,98 15,20%	R\$ 39.969,30 15,44%	R\$ 16.642,11 6,43%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				7.335,41	7.335,41	R\$ 7.335,41 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,0	6,0	100,0%	2.985,90	2.985,90	R\$ 2.985,90 100,00%					
2.1.2	TAXAS E EMOLUMENTOS	1,0	1,0	100,0%	275,33	275,33	R\$ 275,33 100,00%					
2.1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	6,0	6,0	100,0%	4.074,18	4.074,18	R\$ 4.074,18 100,00%					
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1.512,44	1.512,44	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 1.512,44 100,00%	R\$ 0,00 0,00%
2.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	10,29	10,29	100,0%	649,60	649,60					R\$ 10,29 R\$ 649,60 100,00%	
2.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA	18,52	18,52	100,0%	183,16	183,16					R\$ 18,52 R\$ 183,16 100,00%	
2.2.3	CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	185,2	185,2	100,0%	679,68	679,68					R\$ 185,2 R\$ 679,68 100,00%	
2.3	INFRAESTRUTURA				35.371,34	35.371,34	R\$ 34.481,50 97,46%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 889,84 2,51%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
2.3.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	69,43	69,43	100,0%	3.922,10	3.922,10	R\$ 3.922,10 100,00%					
2.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	17,07	17,07	100,0%	1.615,16	1.615,16	R\$ 1.615,16 100,00%					
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	11,2	11,2	100,0%	425,04	425,04	R\$ 425,04 100,00%					
2.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	114,46	114,46	100,0%	3.016,02	3.016,02	R\$ 3.016,02 100,00%					
2.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	0,63	0,63	100,0%	15,93	15,93	R\$ 15,93 100,00%					
2.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	131,31	131,31	100,0%	3.156,69	3.156,69	R\$ 3.156,69 100,00%					
2.3.7	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO CERÂMICO FURADO 9X14X24 CM	28,17	28,17	100,0%	2.725,44	2.725,44	R\$ 2.725,44 100,00%					
2.3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	133,11	133,11	100,0%	2.881,83	2.881,83	R\$ 2.881,83 100,00%					
2.3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	161,47	161,47	100,0%	2.966,20	2.966,20	R\$ 113,03 R\$ 2.076,36 70,00%			R\$ 48,44 R\$ 889,84 30,00%		
2.3.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	48,29	48,29	100,0%	3.528,06	3.528,06	R\$ 48,29 R\$ 3.528,06 100,00%					
2.3.11	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	5,87	5,87	100,0%	4.058,34	4.058,34	R\$ 4.058,34 100,00%					
2.3.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	5,87	5,87	100,0%	1.869,77	1.869,77	R\$ 5,87 R\$ 1.869,77 100,00%					
2.3.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	105,14	105,14	100,0%	5.190,76	5.190,76	R\$ 105,14 R\$ 5.190,76 100,00%					
2.4	SUPERESTRUTURA				54.511,30	54.511,30	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 49.886,79 91,51%	R\$ 3.974,13 7,29%	R\$ 650,36 1,19%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
2.4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	220,86	220,86	100,0%	5.819,66	5.819,66	R\$ 220,86 R\$ 5.819,66 100,00%					



2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	8,37	8,37	100,0%	211,67	211,67		8,37 R\$ 211,67 100,00%						
2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	189,09	189,09	100,0%	4.536,26	4.536,26		189,09 R\$ 4.536,26 100,00%						
2.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	284,85	284,85	100,0%	6.135,66	6.135,66		257,0 R\$ 5.535,78 90,22%		27,85 R\$ 599,88 9,78%				
2.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	45,27	45,27	100,0%	823,46	823,46		45,27 R\$ 823,46 100,00%						
2.4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	104,08	104,08	100,0%	15.112,41	15.112,41		90,0 R\$ 13.068,00 86,47%	14,08 R\$ 2.044,41 13,53%					
2.4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	68,22	68,22	100,0%	8.891,11	8.891,11		60,0 R\$ 7.819,80 87,95%	8,22 R\$ 1.071,31 12,05%					
2.4.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020	5,92	5,92	100,0%	1.689,21	1.689,21		5,92 R\$ 1.689,21 100,00%						
2.4.9	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	5,92	5,92	100,0%	90,81	90,81		5,92 R\$ 90,81 100,00%						
2.4.10	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	9,2	9,2	100,0%	6.360,59	6.360,60		8,3 R\$ 5.738,37 90,22%	0,85 R\$ 587,66 9,24%	0,05 R\$ 34,56 0,54%				
2.4.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	9,2	9,2	100,0%	2.930,46	2.930,47		8,3 R\$ 2.643,79 90,22%	0,85 R\$ 270,75 9,24%	0,05 R\$ 15,92 0,54%				
2.4.12	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	8,4	8,4	100,0%	741,30	741,30		8,4 R\$ 741,30 100,00%						
2.4.13	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	8,4	8,4	100,0%	722,98	722,98		8,4 R\$ 722,98 100,00%						
2.4.14	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	5,6	5,6	100,0%	445,70	445,70		5,6 R\$ 445,70 100,00%						
2.5	PAREDES E PAINÉIS				40.905,64		R\$ 7.291,78 17,82%	R\$ 20.989,60 51,31%	R\$ 8.229,75 20,11%	R\$ 4.394,50 10,74%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%		
2.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	65,95	65,95	100,0%	10.224,88	10.224,88		24,64 R\$ 3.820,18 37,36%	41,31 R\$ 6.404,70 62,64%					
2.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESSURA 09CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	117,42	117,42	100,0%	14.823,10	14.823,10		27,5 R\$ 3.471,60 23,42%	89,92 R\$ 11.351,50 76,58%					
2.5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	445,19	445,19	100,0%	3.592,67	3.592,68		400,67 R\$ 3.233,40 90,00%	44,52 R\$ 359,27 10,00%					
2.5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	445,19	445,19	100,0%	12.264,98	12.264,98			285,68 R\$ 7.870,48 64,17%	159,51 R\$ 4.394,50 35,83%				
2.6	PISO E PAVIMENTAÇÃO				29.413,52		R\$ 0,00 0,00%	R\$ 1.364,39 4,63%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 11.407,02 38,78%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 16.642,11 56,57%		
2.6.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	25,56	25,56	100,0%	2.728,78	2.728,78		12,78 R\$ 1.364,39 50,00%						
2.6.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	77,55	77,55	100,0%	13.988,46	13.988,46							77,55 R\$ 13.988,46 100,00%	



2.6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	50,23	50,23	100,0%	7.433,53	7.433,53												50,23 R\$ 7.433,53 100,00%		
2.6.4	RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	50,23	50,23	100,0%	2.653,65	2.653,65													50,23 R\$ 2.653,65 100,00%	
2.6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	1,6	1,6	100,0%	1.674,83	1.674,83												1,6 R\$ 1.674,83 100,00%		
2.6.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. FORRO E COBERTURA	6,28	6,28	100,0%	934,27	934,27												6,28 R\$ 934,27 100,00%		
2.7						54.595,92	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 29.216,34 53,51%	R\$ 11.187,76 20,49%	R\$ 14.191,82 25,99%	R\$ 0,00 0,00%								
2.7.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	127,78	127,78	100,0%	14.138,85	14.138,85													127,78 R\$ 14.138,85 100,00%	
2.7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	3,0	3,0	100,0%	4.974,21	4.974,21												3,0 R\$ 4.974,21 100,00%		
2.7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	50,23	50,23	100,0%	3.633,13	3.633,13												50,23 R\$ 3.633,13 100,00%		
2.7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	2,0	2,0	100,0%	2.712,12	2.712,12												2,0 R\$ 2.712,12 100,00%		
2.7.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	4,0	4,0	100,0%	7.376,40	7.376,40												4,0 R\$ 7.376,40 100,00%		
2.7.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	78,36	78,36	100,0%	1.506,07	1.506,07												78,0 R\$ 1.499,16 99,54%	0,36 R\$ 6,91 0,46%	
2.7.7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	127,78	127,78	100,0%	7.546,68	7.546,68												127,0 R\$ 7.500,62 99,39%	0,78 R\$ 46,06 0,61%	
2.7.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	36,48	36,48	100,0%	2.621,08	2.621,08												36,48 R\$ 2.621,08 100,00%		
2.7.9	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	74,06	74,06	100,0%	4.900,55	4.900,55												74,06 R\$ 4.900,55 100,00%		
2.7.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	20,1	20,1	100,0%	1.787,49	1.787,49												17,1 R\$ 1.520,70 85,07%	3,0 R\$ 266,79 14,93%	
2.7.11	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	45,17	45,17	100,0%	2.910,75	2.910,75												45,17 R\$ 2.910,75 100,00%		
2.7.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	11,0	11,0	100,0%	424,82	424,82												11,0 R\$ 424,82 100,00%		
2.7.13	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	1,0	1,0	100,0%	63,77	63,77												1,0 R\$ 63,77 100,00%		
2.8	PINTURA E ACABAMENTO					19.009,12	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 10.801,50 56,82%	R\$ 8.207,62 43,17%	R\$ 0,00 0,00%								
2.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	445,19	445,19	100,0%	1.197,56	1.197,56												445,19 R\$ 1.197,56 100,00%		
2.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	445,19	445,19	100,0%	7.959,99	7.959,99													445,19 R\$ 7.959,99 100,00%	



Câmara Municipal de Alto Alegre dos Paracis
 Proc. n° _____
 fls. n° _____

 CPL

Câmara Municipal de Alto Alegre dos Parecis
 Proc. nº _____
 fls. nº _____

 CPL

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RJ 16517D-RJ

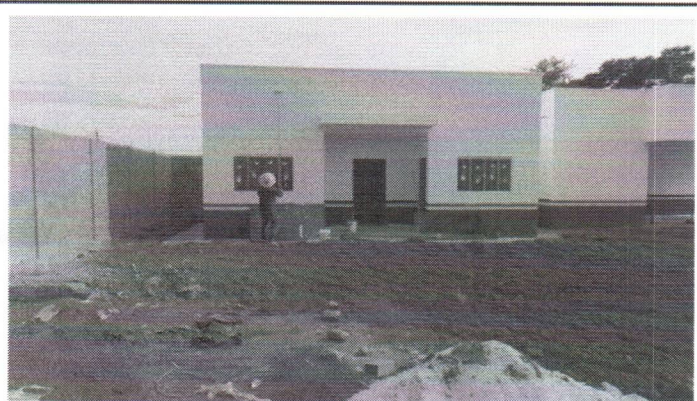


	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000106
	Dias Decorridos: 161	Data: 23/02/2023 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Término: -69	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Término Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PINTOR (HORISTA)	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PINTURA EPOXY 2 DEMAOS COM MASSA	0,0		nenhum	

Galeria de Fotos PINTURA GERAL 	
---	--

Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico




	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000108
	Dias Decorridos: 172	Data: 06/03/2023 (Segunda-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -80	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0.0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PISO, RODAPE GRANILITE, 	PISO, RODAPE GRANILITE, 

Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico



Dias Contratuais: 92

RDO: 00000109

Dias Decorridos: 173

Data: 07/03/2023 (Terça-Feira)

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO

Dias para Terminar: -81

Início: 16/09/2022

Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000

Termino Previsto: 16/12/2022

Relatório Diário de Obra

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0.0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

PISO, RODAPE GRANILITE,



PISO, RODAPE GRANILITE,



Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18517D-RO

Responsável Técnico

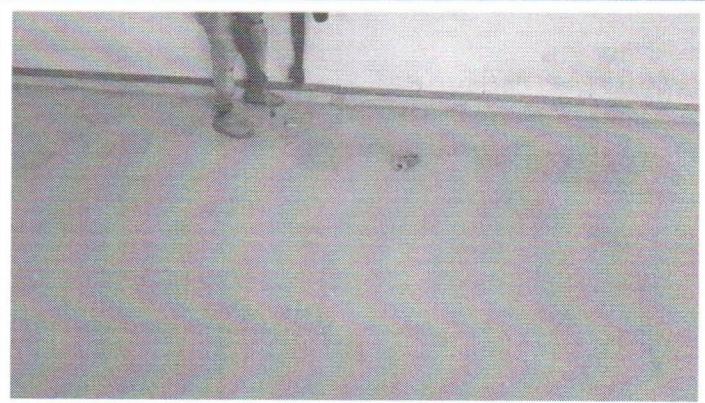


	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000110
	Dias Decorridos: 174	Data: 08/03/2023 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -82	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0.0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PISO, RODAPE GRANILITE, 	PISO, RODAPE GRANILITE, 

Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 186170-RO

Responsável Técnico





	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000111
	Dias Decorridos: 175	Data: 09/03/2023 (Quinta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -83	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

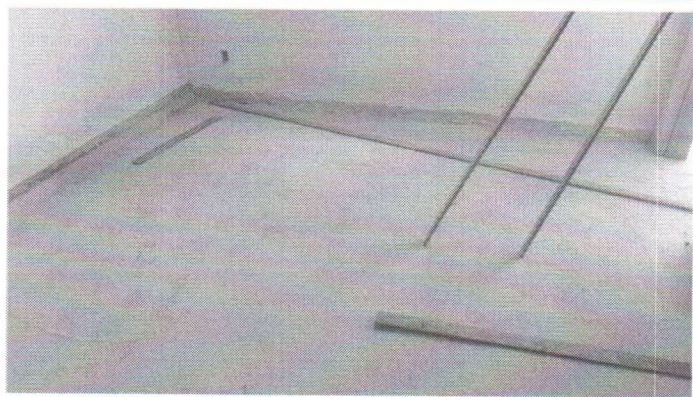
Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0.0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos

PISO, RODAPE GRANILITE,



PISO, RODAPE GRANILITE,



Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico

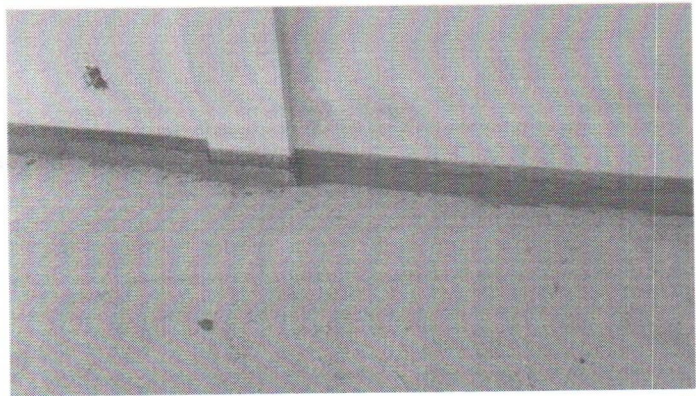
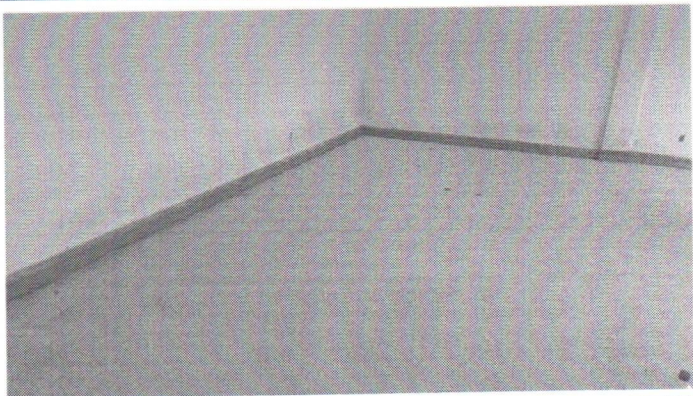


	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000112
	Dias Decorridos: 176	Data: 10/03/2023 (Sexta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -84	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000		Termino Previsto: 16/12/2022
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0.0	m²	nenhum	
RODAPE DE MARMORITE OU GRANILITE	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PISO, RODAPE GRANILITE, 	PISO, RODAPE GRANILITE, 

Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico



	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000113
	Dias Decorridos: 179	Data: 13/03/2023 (Segunda-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -87	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

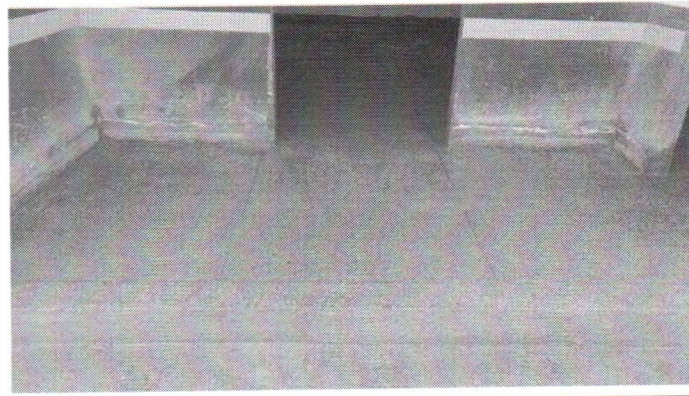
Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0,0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0,0		nenhum	

Galeria de Fotos

PISO, RODAPE GRANILITE,



PISO, RODAPE GRANILITE,



Fiscal

Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico

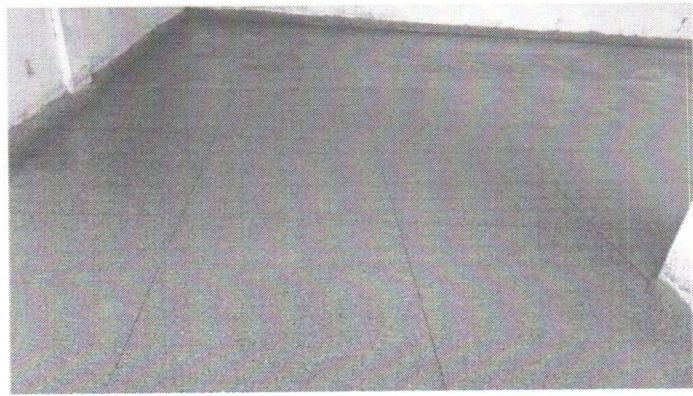


	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000114
	Dias Decorridos: 180	Data: 14/03/2023 (Terça-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Término: -88	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Término Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0.0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0.0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PISO, RODAPE GRANILITE, 	PISO, RODAPE GRANILITE, 

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 18617D-RO

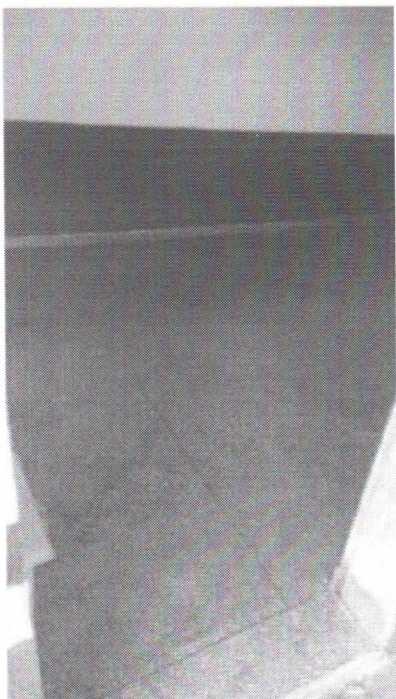
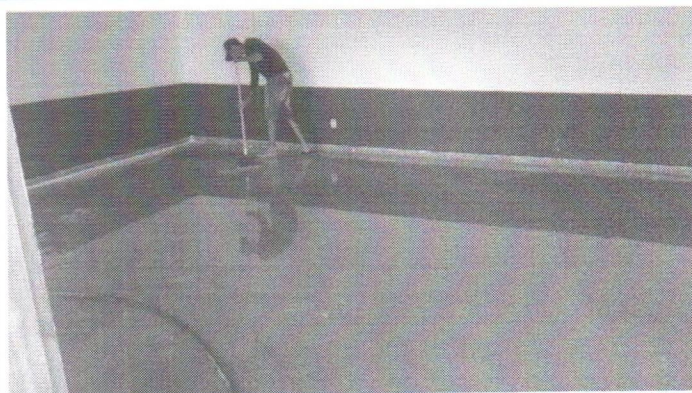
Responsável Técnico

	Dias Contratuais: 92	RDO: 00000115
	Dias Decorridos: 181	Data: 15/03/2023 (Quarta-Feira)
Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO	Dias para Terminar: -89	Início: 16/09/2022
Endereço: AV. Afonso Pena, CENTRO, 3951, Alto Alegre dos Parecis - RO, 76952-000	Termino Previsto: 16/12/2022	
Relatório Diário de Obra		

Mãos de Obra	Quant.	Empreiteiro
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	1	
SERVENTE DE OBRAS	2	
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2	

Equipamentos	Quant.	Empreiteiro
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1	
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2	

Atividades / Tarefas	Quantit.	Unid.	Status	Empreiteiro
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	0,0	m²	nenhum	
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE	0,0		nenhum	

Galeria de Fotos	
PISO, RODAPE GRANILITE, 	PISO, RODAPE GRANILITE, 

Fiscal



Joel Tavares dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-RO 185170-RO

Responsável Técnico
